



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНУДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

ДОГОВОРНО С: 2019-0021-1

ЗА ИНЖЕНЕРИНГ
(ПРОЕКТИРАНЕ
И
СТРОИТЕЛСТВО):

ОБЕКТ:

Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – „Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

Забележка: Съгласно спецификата на конкретната поръчка, Възложителят следва да допълни текстове в настоящия Договор на местата, маркирани с многоточие.

На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след проведена обществена поръчка с предмет: "Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – „Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“, открита по реда на чл. 112 от ЗОП с Решение № ЗУП-3-15/13.12.2019 г. на възложител д-р инж. Сава Савов – управител на „ВиК“ ООД – гр. Русе, в изпълнение на Решение № ЗУП-3-20/26.11.2020 г. на Възложителя за определяне на изпълнител,

на дата: 05.03.2021., в гр. Русе, Република България, се сключи настоящият Договор между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе
седалище и адрес:	гр. Русе 7000, ул. „Добруджа“ № 6
ЕИК:	827184123
ИН по ЗДДС:	BG827184123
представяван от:	д-р инж. Сава Савов

наричан по-нататък "Възложител",

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ:	ДЗЗД „ВиК Русе 2020“
седалище и адрес:	Република България, област София, община Столична, град София, п.к. 1111, р-н Слатина, ул. „Николай Коперник“ № 25, тел.02/80-79-550; факс: 02/973-31-78; e-mail: rousse@isa2000.bg
ЕИК:	177468653
ИН по ЗДДС:	BG177468653
представяван от:	Юлиян Седефов Инджов

наричан по-нататък "Изпълнител".

Настоящият Договор е свързан с възлагане на дейност в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК" безвъзмездна финансова помощ № Д-34-62/31.07.2019 г. „Изграждане на ВиК инфраструктура

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Русе", финансиран от ЕС и правителството на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”.

Договор част I: ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Като се има предвид, че Възложителят желае да възложи Обект: Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – „Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“, в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и предвид на това, че Възложителят е приел Офертата на Изпълнителя,

Възложителят и Изпълнителят се договарят за следното:

1. Договор

1.1 Думите и изразите в това Договорно споразумение и всички документи, съставляващи Договора, ще имат значение и ще се интерпретират според дефинициите в Договорните условия.

1.2 Следните документи (съставни части на Договора), в реда, посочен по-долу, се считат за съставляващи и формиращи Договора, като следва да се разглеждат като взаимно обясняващи се едни други. За целите на тълкуването, приоритетът на документите е със следната последователност:

1. Настоящото Договорно споразумение;
2. Приложението към Офертата;
3. Специфичните Условия;
4. Общите Условия - “ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия”. Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г., Издание в български превод: Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) - единствен пълноправен член и представител на FIDIC за България, 2008 г.;
5. Изискванията на Възложителя;
6. Разясненията на Възложителя и отговори на въпроси, поставени от участниците в периода за подаване на оферти;
7. Таблиците, от които да се използват единичните цени;
8. Офертата на Изпълнителя - предложение за изпълнение на поръчката – Техническа оферта и Предлагана цена;
9. Отговори на въпроси, поставени от оценителната комисия по време на оценката относно изясняване на обстоятелства по офертата на участника, определен за Изпълнител;
10. Всички останали документи, формиращи част от Договора, изискуеми за подписване на Договора;
11. Декларация за нередности, подписана от Изпълнителя.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНЕДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

1.3 Всички изброени документи са неразделна част от Договора и следва да бъдат четени и интерпретирани с оглед на целостта на Договора. В случай на противоречия между изброените документи, приоритетът им ще бъде по реда, посочен в Договорните условия.

2. Предмет

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – „Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“, в т.ч.:

- Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането ѝ в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за Обект Инженеринг на обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – „Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“ в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Строежът на обекта е „втора категория“, съгласно чл. 137, ал. 1, буква “б” ЗУТ.
- Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база;
- Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;
- Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за реализация на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, Договора, изискванията на Възложителя и чертежите и таблиците;
- Осъществяване на авторски надзор, съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ, предоставяне на технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;
- Изготвяне на изпълнителна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
- Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта;
- Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера;
- Извършване на всички необходими проби и тестове по време на изпълнение на СМР до завършване на обекта и предаването му на Възложителя, както и проби след завършване;



Задължен Ганю
Соптиско Е. Ч. ОРЗ

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

- Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/без издаването на Образец 16 да е включено във времето за завършване/;
- Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти в гаранционния срок за експлоатация на обекта.

3. Цени

3.1 Възложителят, с настоящото, се съгласява да заплати на Изпълнителя Договорната сума, в сроковете и по начина, предписани в Договора.

3.2 Приетата договорна сума е **ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА С ПРОВИЗОРНИ СУМИ БЕЗ ДДС**, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, която възлиза на:

А: ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА ПО ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ

(без провизорни суми):

7 471 408,14 лева, (седем милиона четиристотин седемдесет и една хиляди четиристотин и осем лева и четиринадесет стотинки),

/словом/

Б: ПРОВИЗОРНИ СУМИ-

722 040,81 лева, (седемстотин двадесет и две хиляди и четиридесет лева и осемдесет и една стотинки),

/словом/

С: ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПРИЕТА ДОГОВОРНА СУМА)

(А + Б, т.е. цена за изпълнение на обекта по Ценови таблици и провизорни суми)

8 193 448,95 лева, (осем милиона сто деветдесет и три хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки).

/словом/

3.3 Провизорните суми са сумите за покриване на непредвидените разходи, които към момента на подготовката на офертата обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за изпълнението на Обекта.

3.4 Включените в цената на Договора провизорни суми се изплащат само по разпореждане на Инженера и след одобрение на Възложителя, по реда, предвиден в Договора.

3.5 Изпълнителят подлежи на данъчно облагане според нормите на българското данъчно законодателство. Възложителят заплаща на Изпълнителя ДДС върху стойността на изпълнените работи в сроковете и при условията на действащото българско законодателство.

3.6 Предложената от Изпълнителя цена по Ценови таблици включва всички необходими разходи за покриване на всичките му задължения съгласно Договора. Цената включва всички провизорни

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Замислен - Ганги
Ожиаско кет. 4 0930



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

без ДДС към Изпълнителя на обществената поръчка, включително предвидените опции и подновявания на договора, посочени изрично в условията на обществената поръчка.

3.7 Промени в цената се допускат, спазвайки разпоредбите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки, условията и реда, предвидени в Договора.

4. Срокове

4.1 Договорът се счита за сключен от датата на подписване на това Договорно споразумение от двете страни и ще остане обвързващ за двете страни до изпълнение от тях на всичките им задължения съгласно документите, съставляващи Договора, освен ако не бъде прекратен по-рано по предвидения в Договора ред.

4.2 Договорът влиза в сила при осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят се уведомява от Възложителя. В случай, че в срок от 3 месеца от подписването на договора, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните по него може да поиска прекратяване без предизвестие.

4.3 Датата за Започване от Изпълнителя на работите по Договора е съгласно Договорните условия – под клауза 8.1.

4.4 Междинните срокове за изпълнение на отделните задължения на Страните са посочени в Общите условия на Договора, Специфичните условия на Договора и Приложението към офертата.

4.5 Срокът за изпълнение на Договора съгласно условията на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя е:

А/ Време за завършване: не по-късно от 30.06.2022 г. за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на Обекта (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера);

Б/ Отговорност по време на период за съобщаване на дефекти: 365 кал. дни (считано от издаване на Сертификат за приемане от Инженера до издаване на Сертификат за изпълнение от Инженера);

4.6 Времето за завършване може да бъде удължавано само по реда на Договора и единствено на основанията, предвидени в Договора, при наличие на някое от основанията в чл. 116 ЗОП. За избягване на всякакво съмнение, страните изрично се договарят, че съставянето на Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството – Приложение No 10 към чл. 7, ал. 3 т. 10 от Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството („Акт Образец No 10“) няма автоматично конститутивно действие по отношение удължаване на Времето за Завършване. В случаите на спиране на строителството, времето за завършване може да бъде удължавано само по реда на Договора и единствено на основанията, предвидени в Договора, при наличие на някое от основанията в чл. 116 ЗОП.

4.7 Отговорността по време на периода за съобщаване на дефекти може да бъде удължавана съгласно под клауза 11.3 Удължаване на Срока за Съобщаване на Дефекти.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Завършени данни
изгаснали
с. 11/03/20



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

4.8 Посоченият в т. 4.5 по-горе срок за завършване произтича от условията на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП), с който Изпълнителят е обвързан. В случай на изменението му, касаещо и настоящия договор, то времето за завършване може да бъде изменено по инициатива на всяка от страните, но след изричното съгласие на Възложителя. За целта страните подписват допълнително споразумение по реда на настоящия Договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

1. Приложението към Офертата;
2. Специфичните Условия;
3. Общите Условия - "ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия". Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г., Издание в български превод: Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК), 2008 г.
4. Изискванията на Възложителя;
5. Разясненията на Възложителя и отговори на въпроси, поставени от участниците в периода за подаване на оферти;
6. Таблици;
7. Офертата на Изпълнителя - Предложение за изпълнение на поръчката – Техническа оферта и Ценова оферта;
8. Отговори на въпроси, поставени от оценителната комисия по време на оценката относно изясняване на обстоятелства по офертата на участника, определен за изпълнител;
9. Всички останали документи, формиращи част от Договора, изискуеми за подписване на Договора;
10. Декларация за нередности, подписана от Изпълнителя.

Това Споразумение се подписва на посочената най-отпред дата в три екземпляра – по два за Възложителя и един за Изпълнителя - от надлежно упълномощени представители на страните, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

.....
/д-р инж. Сава Савов – Управител

ИЗПЪЛНИТЕЛ


.....
Залички датки
Съгласно чл. 4 от ЗЗ
/инж. Юлиян Инджов – управител/

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД




ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНА МЕНЕДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Договор част 2:
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОФЕРТАТА
/прилага се попълнен образец/




*Замислен датум
съгласно чл. 4 от ЗД*

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНАДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Договор част 3: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Настоящото изпълнение се ръководи от "ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия". Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г., издание в български превод: Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК), 2008 г., с изключение на случаите, в които е налице противоречие с приложимата национална правна рамка.

За контакт:

Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти /БААИК/
тел.: +359 2983 9041 / +359 2983 15 99
e-mail: bacea@techno-link.com

Ползването на общите договорни условия на ФИДИК се урежда съобразно Закона за авторското право и сродните му права.

Договор част 4: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Настоящите Специфични условия изменят и допълват Общите условия.

Номерацията на клаузите в тези Специфични условия следва номерацията на клаузите в посочените Общи условия, освен където са добавени нови клаузи и/или под-клаузи.

Всички термини следва да се разбират по смисъла на определенията, посочени в Общите условия, освен тези, които са определени в настоящите Специфични условия, за които ще важат определенията, дадени в Специфичните условия.

1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1 Определения

1.1.1 Договорът

1.1.1.1 Договор

Текстът се замества със следния текст:

„Договор означава това Договорно споразумение; Приложението към офертата; Специфичните Условия; Общите Условия; Изискванията на Възложителя; Разясненията на Възложителя и отговори на въпроси, поставени от участниците в периода за подаване на оферти; Таблиците; Офертата на Изпълнителя - Техническа оферта и Ценова оферта; Отговори на въпроси,

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

поставени от оценителната комисия по време на оценката относно изясняване на обстоятелства по офертата на участника, определен за изпълнител; Всички останали документи, формиращи част от Договора, изискуеми за подписване на Договора; Декларация за нередности, подписана от Изпълнителя.

1.1.1.3 Писмо за приемане

Заличава се.

1.1.1.4 Писмо към офертата:

Определението относно „Писмо към офертата“ се заменя с „Офертата на Изпълнителя“

1.1.1.5 Изисквания на Възложителя

Текстът се замества със следния текст:

„Изисквания на Възложителя означава Техническите спецификации на Възложителя - всички технически предписания, които се съдържат, по-специално, в документацията за обществената поръчка, определящи изискваните характеристики на Материалите, Стоките или консумативите, така че да отговарят на предвидената от Възложителя употреба; тези характеристики включват ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на околната среда и климата, проектиране, което да отговаря на всички изисквания (включително достъп за хора с увреждания) и оценяване на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране, инструкции за употреба и производствени процеси и методи на всеки етап от жизнения цикъл на строителните работи, правила за проектиране и ценообразуване, условия за изпитване, инспекция и приемане на строителство и методи или технологии на строителство, както и всички други технически условия, които Възложителят може да наложи съгласно общи или специални нормативни актове по отношение на завършено строителство и материалите или частите, включени в него.“

1.1.1.7 Предложение на изпълнителя

Определението относно „Предложение на изпълнителя“ се заменя с „Техническото предложение и Ценовото предложение“

1.1.2. Страни и Лица

1.1.2.2. „Възложител“

Текстът се заличава и заменя със следния: „Възложител“ е лицето, определено като такова по смисъла на приложимото действащо законодателство.

1.1.2.3. „Изпълнител“

Текстът се заличава и заменя със следния: „Изпълнител“ е лицето, определено като такова по смисъла на приложимото действащо законодателство, вкл. „Строител“ по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

www.efunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Заличава се датата 10/30/2014



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНА МЕНДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

1.1.2.5. „Представител на Изпълнителя“

Добавя се второ изречение: „Представител на Изпълнителя“ означава лицето, което го представлява по закон или по силата на нотариално заверено изрично пълномощно, или по силата на друг акт, издаден от Изпълнителя, който дава право на това лице да извършва правни действия от името и за сметка на Изпълнителя.“

1.1.2.8 Подизпълнител

Текстът се замества със следния текст:

„Подизпълнител е лице, което е дало съгласие да изпълни определен дял от предмета на обществената поръчка. Трето лице е лице, чийто капацитет се използва от Възложителя за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и/или финансовото състояние и/или технически възможности за изпълнение на поръчката.“

1.1.2.11 Авторски надзор (Нова)

„Авторски надзор означава контролът, осъществен от проектанта по време на СМР и окончателното приемане чрез подписване на финалните протоколи, екзекутивни чертежи и всички актове и свързани документи съгласно действащото българско законодателство. Авторският надзор е задължителен по всички части.“

1.1.3.10 Гаранционен срок (Нова)

„Гаранционен срок означава гаранционният срок за изпълнените проекти и строително-монтажни работи съгласно приложимото законодателство.“

1.1.3.11 Дата на подписване (Нова)

„Дата на подписване“ означава датата на последния подпис върху Договорното споразумение.

1.1.4 Пари и плащания

1.1.4.1 Приета договорна сума

Текстът се замества със следния текст:

"Приета договорна сума означава общата предлагана цена за изпълнение и завършване на Обекта и отстраняване на всякакви дефекти съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, която е посочена в Договорното споразумение“.

1.1.4.2 Договорна цена

Текстът се замества със следния текст:

"Договорна цена означава цената, чието определение е дадено в под-клауза 1.4.1 "Договорна цена", която включва цените по приетите от Възложителя Ценови таблици в офертата на Изпълнителя и одобрените от Възложителя за усвояване "Провизорни суми" по предвидения в Договора ред."

1.1.4.10 Провизорни суми

*Заложени суми,
съгласно чл. 11
ОПЗ*

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПСОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ

ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Текстът се замества със следния текст:

„Провизорни суми са сумите, съгласно Приложението към офертата, които трябва да бъдат одобрени от Възложителя и наредени от Инженера за заплащане на допълнителни разходи, при условията на настоящия Договор и при спазване на изискванията на чл. 116 от ЗОП. Изпълнителят е необходимо да обоснове дължимостта на плащанията като тази обосновка е предмет на разглеждане и одобрение от страна на Инженера и Възложителя. Последният има право по всяко време да изисква допълнителни данни и информация, вкл. да не ги приеме като в този случай плащания в рамките на провизорните суми не са дължими.“

1.2 Тълкуване

Създава се нова буква (е) със следния текст:

“Навсякъде в този договор размерът на печалбата в текстовете, включващи израза “разходи плюс разумна печалба”, се фиксира като надбавка от 5% върху размера на съответните действителни разходи”.

1.3 Съобщения

Накрая се добавя текстът:

„Избраният начин на изпращане на съобщенията трябва да позволява удостоверяване на датата на получаването на изпратените документи. Възложителят има право да отправя допълнителни инструкции относно процедирането на съобщенията“.

1.5 Приоритет на документите

Текстът се замества със следния текст:

„Съгласно точка 1.2 от това Договорно споразумение.“

1.6 Договорно споразумение

Текстът се изтрива и се заменя със следния:

„Страните сключват Договорно Споразумение по реда и предпоставките, предвидени в българския Закон за обществените поръчки. Договорното споразумение следва да отговаря на проекта на същото, приложен в документацията за участие в обществената поръчка”.

1.8 Грижа за и предоставяне на Документи


В края на второто изречение от първия абзац се заличава „шест копия” и се заменя с „три копия, включително всички налични документи в електронен вид”.

1.9 Забавени Чертежи или Указания

Наименованието на под-клаузата се заличава и заменя с „Грешки в изискванията на Възложителя“

1.10 Ползване от Възложителя на Документация на Изпълнителя

В края на под-клаузата се добавя следния параграф:



Заличени документи
Собственост
Ст. 4
ОПЗД

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

„Изпълнителят ще осигури необходимите обучения на обслужващия съоръженията персонал, по време на които ще бъдат ползвани разработените и доставени от Изпълнителя Обучителни материали за експлоатация и поддръжка на оборудването и съоръженията, както и обучителни ръководства.”

1.12 Поверителни данни

Накрая се добавя следния текст:

Изпълнителят ще се отнася към данните от Договора като лични и поверителни, освен доколкото е необходимо за изпълнение на задълженията по този Договор или придържане към действащ закон. Изпълнителят няма да публикува, да позволява да бъдат публикувани или разкрити каквито и да е подробности във връзка със строително-монтажните работи без предварителното писмено одобрение от Възложителя. Също така, Изпълнителят ще разкрива цялата поверителна и друга информация при поискване от проверители и одитори от организации – донори на финансови средства за Възложителя, когато са официално представени от Възложителя.

1.15 (Нова) Проверки и одити

Изпълнителят ще осигури пълен достъп и съдействие на посочени от Възложителя лица за осъществяване на проверки и одити на изпълнението на договора.

2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

2.4. Финансови мерки на Възложителя

Текстът се заличава.

2.5. Искове на Възложителя

Последният параграф на тази Под-Клауза се заличава и заменя със следния текст:

„Тази сума може да бъде събрана принудително от Възложителя чрез:

- (а) прихващане от стойността на вече издадени Актове за Междинно плащане или от Задържаната Сума, или;
- (б) усвояване на суми по Гаранцията за Изпълнение съгласно Под-Клауза 4.2“


3 ИНЖЕНЕРЪТ

3.1 Задължения и правомощия на Инженера

Заличава се четвъртият параграф (започващ с „Все пак винаги когато...“) от под-клаузата.


Накрая се добавя следният текст:

„Инженерът е лице, упражняващо строителен надзор, по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Инженерът носи отговорност съгласно чл. 168, ал. 1 от ЗУТ.

Инженерът подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредбата за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. Всички актове и протоколи се подписват и подпечатват и от управителя на лицето, упражняващо строителен надзор.

Предписанията и заповедите на Инженера, вписани в заповедната книга, са задължителни за Изпълнителя. Възражения срещу предписанията на Инженера, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания.

При нарушаване на техническите правила и нормативи, Инженерът е длъжен да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.

След приключване на строително-монтажните работи Инженерът изготвя окончателен доклад до Възложителя.

Инженерът, в тридневен срок от съставянето на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия, заверява Заповедната книга на строежа и уведомява писмено в 7-дневен срок от заверката Възложителя, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол.”

Следните уговорки се прилагат:

Инженерът трябва да предложи действия и да получи специфичното писмено одобрение от Възложителя, преди да предприеме тези действия на основание следните Под-Клаузи на Договорните условия:

- Под-Клауза 1.9: Забавени чертежи или Указания
- Под-Клауза 2.1: Право на Достъп до Площадката
- Под-Клауза 3.5: Решения
- Под-Клауза 4.7: Отлагане върху Терена
- Под-Клауза 4.12: Непредвидими физически условия
- Под-Клауза 4.24: Находки
- Под-Клауза 7.4: Проби
- Под-Клауза .8.5: Закъснения причинени от властите
- Под-Клауза 8.4: Удължаване на Времето за Завършване
- Под-Клауза 8.8: Прекъсване на Работа
- Под-Клауза 8.9: Последствия от Прекъсване
- Под-Клауза 10.3: Пречки при Проби при Завършване


www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.


Ж. БОК РУС
Завършени работи,
съгласно чл. 40РЗД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Под-Клауза 11.8: Изпълнителят да Търси

Под-Клауза 12.3: Оценяване

Под-Клауза 13.1: Нареджане за Промяна

Под-Клауза 13.3: Одобряване на предложение за Промяна подадено от Изпълнителя, по силата на Под-клауза 13.1

Под-Клауза 13.4: Уточняване на платимата сума във всяка от приложимите валути

Под-Клауза 13.5: Провизорни Суми

Под-Клауза 13.8 Корекции при промяна в разходите

Под-Клауза 13.7: Корекции при Промени в Законодателството

Под-Клауза 16.1: Право на Изпълнителя да Прекъсне Работа

Под-Клауза 17.4: Последници от Рискове за Възложителя

Под-Клауза 19.4: Последствия от Непреодолимата Сила

Под-Клауза 20.1: Искове на Изпълнителя

Задължението за получаване на изрично специфично писмено одобрение от Възложителя може да не се спазва, когато по мнението на Инженера има аварийна ситуация, заплашваща безопасността на площадката или на съседни имоти или здравето и живота на персонала. При такива обстоятелства, Инженерът, без да освобождава Изпълнителя от неговите задължения и отговорности, може да му нареди да изпълнят работи или да извършат действия, които по мнението на Инженера са необходими за преодоляване или намаляване на риска. Изпълнителят ще се съобрази с такива нареждания въпреки отсъствието на одобрение от Възложителя.

3.3 Указания на Инженера

Текстът се допълва, както накрая се добавя следният текст:

„Инженерът разрешава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. от 1 ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа. Задължения на Възложителя, възникващи вследствие разрешаване на тези спорове, могат едностранно да бъдат отхвърляни от него.

Инженерът се съобразява с предписанията на физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна".

Решението на лицето, упражняващо строителен надзор за строежа, е задължително за Изпълнителя.”

3.5 Решения

Текстът на изречение второ на параграф едно се заличава и заменя със следната разпоредба:

„Ако не е постигнато споразумение, в срок до 28 дни, след като е бил надлежно уведомен за съответното събитие, Инженерът трябва да вземе справедливо решение съгласно Договора, като се съобрази подобаващо с всички обстоятелства, свързани с това.“. Решението може да бъде

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПСОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

отхвърлено едностранно от Възложителят в случай, че последният го намери за неправилно, вкл. недостатъчно обосновано отчитайки фактическата обстановка.

3.6 Срещи за отчитане на напредъка (Нова)

„Инженерът ще организира на редовни интервали, не по-рядко от веднъж на месец, срещи за отчитане на напредъка и планиране на работите през следващия период, като уведомява за тях всички участници в строителния процес минимум 3 (три) работни дни преди датата на срещата.

На срещите ще присъстват Инженерът, Възложителят, Изпълнителят, Авторският надзор, както и при необходимост - представители на други заинтересовани страни, вкл. представители на Звеното за управление на проекта.

Инженерът ще води писмени протоколи от тези срещи съгласно предварително утвърден образец.

Инженерът ще предоставя протоколите в електронен вид на всички участници не по-късно от 3 (три) работни дни след провеждане на срещата.

Предложения за допълнения към проекта на протокол ще се правят до 7 (седем) работни дни след получаването му.

Окончателният протокол ще се изпраща до 2 (два) работни дни след получаване на предложенията.

Протоколите от срещите ще се считат за официален запис по дискутираните въпроси, но не могат да заместят документи, които по силата на този Договор изискват официално одобрение, инструкции или решения.“

4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

4.1 Общи задължения на Изпълнителя

Добавя се нов последен параграф в под-клауза 4.1 със следното съдържание:


„Изпълнителят е „строител“ по смисъла на ЗУТ и е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.

Строителят носи отговорност за:

1. изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и


----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.






ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

2. изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите;
3. съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, когато това е определено от възложителя, както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа;
4. съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 ЗУТ.

Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

Строителят е длъжен да изпълни обекта с посочените от него в офертата му ключови експерти. Замяна на предварително посочените от Изпълнителя ключови експерти се допуска по преценка на Възложителя и при спазване на приложимото законодателство.

Забавяне на плащанията от страна на Възложителя не е основание за спиране или забавяне на строително-монтажните работи от страна на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да проектира и изпълни възлаганите в рамките на договора работи по начин, по който обектът в неговата цялост да функционира и да е годен за неговото обичайно предназначение.“

4.2 Гаранция за изпълнение

Втори параграф на тази под-клауза, се променя със следния текст:

“Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора към комплекта документи за подписване на договора, в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и в размера, определен в Приложението към офертата, с включени провизорни суми - **409 672,45 (словом: четиристотин и девет хиляди шестстотин седемдесет и два лева и четиридесет и пет стотинки) лв.**, в полза на Възложителя. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от Изпълнителя.

Гаранцията е с валидност съгласно приложението към офертата - не по-малко от Срока за завършване плюс Срока за съобщаване на дефекти плюс 28 дни.

Валиден е датуми,
Съгласно чл. 409ЗД

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

В случай, че Изпълнителят е представил гаранция за изпълнение под формата на банкова гаранция или застраховка и при хипотеза на изтичане на срока им преди настъпването на горните условия, Изпълнителят се задължава, не по-късно от 14 дни преди изтичането, да представи нова банкова гаранция или застраховка, отговаряща на изискванията на Договора.

В случай, че банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора, съответно застрахователят, издал Застраховката за изпълнение, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свърхзадължияност, или й/му се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 10 (десет) работни дни от направеното искане, съответна заместваща гаранция/застраховка от друга банкова, съответно застрахователна институция, съгласувана с Възложителя.

Възложителят не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на Договора.

В края на трети параграф на тази под-клауза се добавя следният текст:

„Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение съобразно предходните изречения в параграфа, дори в случаите на спорове с Възложителя относно дефекти на изпълнението, като удължаването следва да бъде до окончателното издаване на Сертификата за изпълнение от Инженера

Договорът не се осъществява на етапи и не включва гаранционно поддържане (работите в периода за съобщаване на дефекти не попада в тази категория предвид определените задължения на Изпълнителя).“

4.3 Представител на Изпълнителя

В трети параграф последното изречение да се допълни с „и Възложителя“.

Във второто изречение на шести параграф след текста: „докато Инженерът“ да се допълни: „и Възложителят не получат“

Накрая на последния параграф се добавя следният текст:

"..., в противен случай Изпълнителят ще осигури за своя сметка по всяко време компетентни преводачи съобразно нуждите и ще бъде отговорен за качеството на превода при предаването на информацията по Договора.

4.4 Подизпълнители

Текстът на под-клаузата се променя, както следва:

„Изпълнителят изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнители...“

*Задължителни данни,
облгено ел. ч
ОРЗ*

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНDOBETE
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

При ползване на подизпълнител, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на Закона за обществени поръчки.

Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата Изпълнителят може да представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

4.5 Обявени Подизпълнители

Текстът на под-клаузата се заличава.

4.6 Сътрудничество

В края на под-клаузата се добавя следният текст:

Изпълнителят се задължава да спазва мерките за информация и комуникация, посочени в Приложение № XII към Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, докладването относно финансовите инструменти, техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и съхранение на данни, както и мерките за информация и комуникация.

Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими действия за популяризиране на факта, че проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Изпълнителят е длъжен да спазва и други относими към неговата работа задължения, произтичащи от обстоятелството, че Възложителят е бенефициент по АДФП, вкл. по отношение на създаваните документи, фактури или други.

Изпълнителят се задължава, при постъпило искане от страна на структурите в МОСВ, отговорни за реализацията на ОПОС, както и одитиращите институции или Европейската комисия, да им представи подкрепящи доказателства във връзка с изпълнението на договора. Структурите в МОСВ, одитиращите институции, както и Европейската комисия имат право да извършват всякакви проверки на документацията или проверки на място, когато това е необходимо.


----- www.eufunds.bg -----

Заличавайки датата, съгласно

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

В случай, че в резултат на проверки, мисии и други подобни от страна на национални или наднационални органи и институции, са налични констатации, пряко или косвено касаещи изпълнението на настоящия договор независимо от аспектите му, то Изпълнителят има задължение своевременно (в рамките на определените срокове) да предприеме действия и отстрани всякакви констатирани несъответствия независимо от характера им.

Под-Клауза 4.7 Отлагане върху Терена

Заличава се текстът на под-клаузата и се заменя със следния:

„По време на изпълнението и при завършването на строителството, изпълнителят трябва да осигури постоянно на строителната площадка опитен геодезист, който да изпълнява и контролира отлагането на терена, както и други геодезични работи. Изпълнителят трябва да отложи Обекта върху терена спрямо оригинални точки и изходни линии и нива, точно описани в Договора или съобщени от Инженера. Инструментите, които ще се използват от Изпълнителя, трябва да са от вид и тип, подходящ за задачите, които ще се изпълняват, както и да са в отлично техническо състояние и настройка.

Изпълнителят ще бъде отговорен за точното разполагане на всички части от Обекта и ще отстранява за своя сметка всяка грешка в геодезичните измервания и съответните последици. Инженерът може да проверява отлагането на терена на всеки етап от строителството, като Изпълнителят ще поддържа необходимата документация, чертежи и други записи за улесняване на тези проверки.

Изпълнителят се задължава да не претендира на основание на настоящия Договор удължаване на времето за завършване или за заплащане на допълнителни разходи в цената на договора вследствие извършване на работа, която е станала неизбежна поради грешка в изходните данни, вкл. относно състоянието на наземната или подземна инфраструктура. Повреждането и последващото възстановяване или изместването на наземна или подземна инфраструктура е за сметка на Изпълнителя независимо дали същата е налична в изходните данни.”

Под-Клауза 4.10 Данни за площадката

Между първи и втори параграфи се добавя следният текст:

„Всички почвени и хидроложки условия, упоменати от Възложителя, се считат за данни, предоставени на Изпълнителя само за информация по силата на Договора. Подобна информация като част от съответните доклади не е тълкуване от страна на Възложителя. Всяко тълкуване е отговорност единствено на Изпълнителя. Същевременно предоставените доклади, части от техническата спецификация/изискванията, следва да се считат за достатъчни за целите на формиране на ценовата оферта на Изпълнителя. Потенциални непълноти в предоставените инвестиционни проекти, разрешителни, проучвания и доклади (прединвестиционно, геоложки, хидрогеоложки и др.), не са основание от страна на Изпълнителя за предявяване на искове по реда на настоящия договор.”

Дарилски Данни
Чл. 4 от 2020

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПСОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Под-Клауза 4.12 Непредвидими Физически Условия

В края на втория параграф след текста „при първа възможност” се добавя:

„но не по късно от седем дни от установяването им” и „с копие до Възложителя”.

Третият параграф се заличава и заменя със следния текст:

„Това съобщение трябва да описва физическите условия, така че те да могат да бъдат огледани от Инженера, и други оправомощени да издават предписания и заповеди лица. Изпълнителят трябва да продължи да изпълнява Обекта, използвайки такива подходящи и разумни мерки, каквито съответстват на физическите условия, и трябва да се придържа към всички указания, каквито Инженерът и други оправомощени да издават предписания и заповеди лица може да дадат. Ако дадено указание налага извършване на допълнителни работи, които са Промяна по смисъла на Клауза 13 [Промени и Корекции], страните следват разпоредбите на под-клауза 13.3 Процедура за Промяна.”

4.18 Опазване на околната среда

Накрая се добавя следният текст:

„Изпълнителят ще отговаря за подходящото събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране, оползотворяване, предаване за депониране или друго третиране на строителните и други отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискванията на българското законодателство, като съгласува действията си с Инженера и Възложителя.

В случай, че Изпълнителят не изпълни някои от мерките по опазване на околната среда, описани в Изискванията на Възложителя, свързани с премахване на отпадъци и съоръжения, оросяване на запрашени участъци, почистване на настилки и тротоари и др. до състояние съгласно Договора, и за което Изпълнителят е получил нареждане/съобщение/предписание от Инженера/Възложителя, но поради своето виновно поведение не е предприел корективни действия, Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани отпадъци и временни съоръжения, да извърши оросяване на запрашени участъци и да почисти настилките и тротоарите, като направените във връзка с това разходи ще бъдат приспаднати от дължимите суми на Изпълнителя. В тези случаи, Инженерът пристъпва към удържане на сумата съгласно под-клауза 14.6 Издаване на Актове за Междинни Плащания.”

4.19 Електричество, вода и газ

Първото изречение на втори параграф се променя, както следва:

“Изпълнителят ще поеме всички ангажименти по осигуряване на електричество, вода и газ (ако е необходимо) за своя сметка, и ще покрие всички свързани с тяхното използване разходи.”

В третия параграф се премахват думите „(по тези цени)”

Възложител
Евросети ЕООД
Ел. Енергия
М. Ф. ОУД

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Русе”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г”. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК” ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНЕДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

4.21. Отчети за напредъка

В първия параграф думата „шест” се заменя с „три комплекта на хартиен и на електронен носител CD/DVD в <*.pdf> и редактируем формат”.

В края на под-клаузата се добавят следните под-точки:

- i) Действителен и планиран статус на персонала и оборудването;
- j) Актуално състояние на разходите, прогнози и прогнозни разходи;
- к) Изпълнителят активно ще подпомага Възложителя и неговите представители при подготовката на изходни данни за изготвяне на доклади, отчети и други документи, отнасящи се до междинни или окончателно искания за плащане и други изискуеми документи в процеса на отчитането на напредъка по АДФП”.

4.23 Действия на Изпълнителя на площадката

Създава се нов втори параграф, със следното съдържание:

„Никакви важни действия на Страните по договора, като прокарване или затваряне на съществуващи пътища, водопроводни и/или канализационни мрежи или други такива мрежи и системи, не могат да бъдат предприемани без предварителното одобрение от Инженера и съответните компетентни органи.

Изпълнителят трябва да информира писмено Инженера не по-късно от 7 (седем) дни, преди започването на такива работи.”

Останалите параграфи се преномерират.

4.25 Техническа инфраструктура (Нова)

„Изпълнителят трябва да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото са известни, отразени в публично достъпни архиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи.

Изпълнителят ще отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, нанесени от него или от лица, ангажирани от него и работещи на площадката.

Всякакви дейности по отстраняване на щети и възстановяване трябва да се извършват по най-бързия възможен начин и във всеки случай преди изтичане на "Срока за завършване".

Изпълнителят ще съгласува с Инженера, Възложителя и съответните компетентни структури, управляващи или поддържащи техническата инфраструктура, работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, в резултат на които да предизвика най-малки смущения за населението.


----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК ООД – Русе”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г”. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на-ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК” ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Във всички случаи, Изпълнителят ще отправя исканията си за съгласуване поне 28 дни преди планираното започване на работите по такива съоръжения, придружени с подходяща обосновка и копия на съответните разрешения, когато е приложимо.

Всички разходи за такива дейности ще са за сметка на Изпълнителя.”

4.26 Разрешения (Нова)

„Изпълнителят ще осигурява за своя сметка необходимите му разрешения според действащото законодателство за извършване на дейностите за изпълнение на Договора, като ще заплаща за своя сметка съответните такси.

Такива разрешения могат да бъдат, например, разрешения за престой и работа, за ползване на радиочестоти, за присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура, за преместване на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, за затваряне и ограничаване на пътища и улици, за депониране на остатъчни земни маси и строителни и други отпадъци, за пребиваване и работа, за преминаване на тежки или опасни товари по пътища и улици, и други, доколкото е приложимо и се изискват от закона.

В срок от 28 дни след подписване на Договорното споразумение, Изпълнителят ще представи на Инженера списък с разрешенията, които са необходими за започване и завършване на работите, заедно с посочени крайни дати за представяне на обосновки за искане на разрешения по начин, че да се спазват ключовите срокове на Договора.

Изпълнителят ще подготви и предава необходимите документи с искане за разрешение в срок, ще спазва приложимите писани или публикувани процедури и ще си сътрудничи със съответните власти с цел да осигури своевременно получаване на разрешенията и спазване на работната програма. При изпълнение на работите, Изпълнителят ще се съобразява с условията на издадените разрешения, ще предоставя възможност за присъствие, контрол или изпитване от страна на представители на надзорни и контролни органи и ще отговаря за всякакви забавяния, свързани с неизпълнение от него на нормативни и други публикувани изисквания или писмени указания/предписания, свързани с тези обстоятелства.

Изпълнителят ще подпомага Възложителя при получаване от последния на разрешения, одобрения и други процедури, свързани със задълженията му по закон като собственик на площадката и възложител на строителния договор, в частност, доколкото е приложимо, при съгласуване на проекти, изготвяне на доклади, издаване на разрешение за строеж, назначаване на приемателни комисии и др., като Изпълнителят ще обезпечи същото финансово.

Изпълнителят ще носи отговорност пред Възложителя, и ще бъде длъжен да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи. Ако

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПСОС 2014-2020 г.

Зависими данни
съгласуван
ед. ч
ОРЗД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Изпълнителят не предприеме необходимите коригиращи действия, Възложителят, ще има право да отправи иск към Изпълнителя съгласно Клауза 2.5 "Искове на Възложителя" от Договора."

4.27. Заповедна книга съгласно НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Нова)

„Изпълнителят ще съхранява Заповедна книга на строежа, съставена и водена в съответствие с действащото българско законодателство.

Заповедната книга ще съдържа инструкциите на Инженера по отношение на качеството на Работите, промени на Чертежите и др. като всяка от тях има уникален номер и дата и са неразделна част от строителната документация. Това не отменя задължението на Инженера да известява страните за такива промени по реда на под-клауза 1.3 [Съобщения].

Заповедната книга ще съдържа също така инструкции от страна на проектанта (както правата и задълженията му са описани в ЗУТ) относно качеството на Работите и точното им изпълнение в съответствие с Чертежите. Инструкциите на проектанта са задължителни за страните.“

4.28 Досие на Обекта (Нова)

„Изпълнителят ще поддържа досие на обекта под формата и във вида, предписан от приложимото законодателство и според указанията на Инженера, и ще се грижи за своевременни записи в него от страна на свои и на другите участници в строителния процес. Поддръжката на досието следва да се извършва и по начин, съответстващ на задълженията на Възложителя в ролята му на бенефициент по АДФП.“

4.29 Конфиденциалност (Нова)

„Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

Изпълнителят се задължава да спазва конфиденциалност по отношение на информация, включваща документи, данни, факти и обстоятелства, които са му станали известни във връзка с изпълнението на Договора. Изпълнителят няма да изнася публично информация за изпълнението на Договора, освен след разрешение от Възложителя или по искане на компетентен орган или с оглед изпълнение на задължение, вменено му по закон.

Изпълнителят се задължава да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, както и да не консултира трети лица извън Възложителя, като Изпълнителят поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си и от подизпълнителите си.

Изпълнителят се задължава да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на договора, като частни и поверителни, и няма право да предоставя това е

Стак Русе
Замислен данни
Секретно
40132


----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

необходимо за целите на изпълнението на договора, да публикува или предоставя на трети лица информация, свързана с договора, без предварителното писмено съгласие на Възложителя или ръководителя на проекта. Ако възникне спор по отношение наложителността на публикуване или обявяване на такава информация за целите на изпълнението на договора, решението на Възложителя е окончателно.“

5 ПРОЕКТ

5.1 Общи задължения за проектиране

Първият параграф се променя както следва:

„Изпълнителят ще осъществи и ще бъде отговорен за проекта на Обекта. Проектът ще бъде изготвен от квалифицирани проектанти, посочени в офертата на Изпълнителя.“

Накрая се добавят следните параграфи със следното съдържание:

“Временното строителство ще се проектира от Изпълнителя като проектите ще бъдат представени на Инженера преди започване на строителството. Изпълнителят ще носи цялата отговорност за проектирането и изграждането на временното строителство, в съответствие с настоящия Договор и действащото законодателство.

Проектите трябва да са разработени в обхват и съдържание съгласно Наредба 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и съгласно действащото законодателство.

Изпълнителят носи отговорност за съгласуване и утвърждаване на проектите със заинтересованите организации и компетентни органи, за целите на одобряване им.


Изпълнителят ще трябва да получи одобрение на проектите след изготвяне на Доклад за оценка на съответствие от Инженера.

Авторските права върху изработените в изпълнение на този Договор проекти принадлежат на Възложителя. Възложителят има изключителните права на територията на Република България и в чужбина. Авторските права, които се прехвърлят на Възложителя включват:

- право на публично разгласяване на предмета на договора;
- право да разрешава употребата на предмета на договора;
- право на възпроизвеждане на предмета на договора;
- правото на разпространение на копия и оригинала на проектите, предмет на договора, сред неограничен брой лица;
- право на преработка и нанасяне на всякакъв вид промени в предмета на договора;
- използването на предмета на договора за създаване на нов или произведен на него продукт;
- други подобни права.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНУДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

5.2 Документи на Изпълнителя

В края на третия параграф се добавя следното изречение:

„Електронна версия на всеки един от тези документи, в одобрен от Инженера формат, ще бъдат предоставени на Инженера и Възложителя.“

5.6 Екзекутивни документи

Под клаузата се заменя със следния текст:

„Изпълнителят е отговорен за извършване на геодезични заснемания на съоръженията на подземната и надземна инфраструктура, за целите на кадастъра, съгласно чл. 116 на ЗУТ във връзка с чл. 177, ал. 1 ЗУТ и чл. 32 и чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър. Всички данни, скици и чертежи трябва текущо да бъдат представяни на Инженера за одобрение и да бъдат съхранявани от Изпълнителя, до приключване на периода за строителство, след което същите трябва да бъдат предадени на Възложителя при подписване на констативен протокол образец 15.

След завършване на Обекта или подобект от него, Изпълнителят ще подготви и предаде на Инженера за проверка Екзекутивна Документация, която ще показва точните местоположения, размери и детайли на работите, както са изпълнени, както и всички разлики между Работите и Чертежите.

Под "екзекутивна документация" ще се разбира цялата проектна документация, актуализирана според реалното изпълнение на обекта и заверена според изискванията на Законите в Държавата, с приложена към нея всякаква друга документация, която обосновава и съгласува извършените отклонения от първоначалните проектни документи.

В срок от минимум 56 дена преди Датата на завършване, Инженерът дава предварителни инструкции до Изпълнителя за вида и пълнотата на Екзекутивната Документация.

В случай, че няма разлики между Работите и Чертежите, копия от съответните Чертежи може да бъдат обозначени като Екзекутивна Документация.


Изпълнителят ще предаде на Инженера три комплекта Екзекутивна Документация, заверена от проектантите и останалите страни, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, за целите на акт образец 15 и издаване на Сертификат за Приемане.

Работите и техните части няма да бъдат считани за завършени за целите на Под-Клауза 10 Сертификат за Приемане на Обекта и Подобекти, докато съответната Екзекутивна Документация не бъде представена на Инженера.“

6 ПЕРСОНАЛ И РАБОТНА СИЛА

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

6.2 Размер на надниците и условия на труда

Под-кlausата се изменя по следния начин:

Изпълнителят заплаща надници, съобразени с минималния месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година

6.7 Здраве и сигурност

Накрая се добавя нов параграф:

„Функциите на "Координатор по безопасност и здраве" на обекта по смисъла на приложимото българско законодателство ще се изпълняват от Инженера.

Преди започване на строителството, Изпълнителят ще разработи "План за безопасност и здраве" (ПБЗ) в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и на основата на проектната документация. Изпълнителят ще се грижи за своевременното актуализиране на "Плана за безопасност и здраве" при всяка промяна на обстоятелствата на площадката с цел да се гарантира сигурността на Обекта и безопасността на работещите на Площадката и на нейните посетители, и ще представя актуализираните документи на Инженера за преглед и одобрение. Инженерът има право в който и да било момент да поиска актуализиране на "Плана за безопасност и здраве" по своя инициатива, а Изпълнителят ще бъде задължен да го направи в срок от 7 дни.

Изпълнителят ще се съобразява с всички противопожарни разпоредби, ще осигурява противопожарно обучение на персонала си и ще предвижда защитни мерки за всички горими и взривоопасни вещества и дейности. Изпълнителят ще поддържа на подходящо място схеми и списъци на складираните на площадката вещества и материали с посочване на тяхната пожароопасност, токсичност при пожар и др. според действащите норми и стандарти с цел да са на разположение на противопожарните служби при необходимост."

6.9 Персонал на Изпълнителя

В първия параграф думата „вещ“ се заменя „с умения".

6.12 Чуждестранен персонал на Изпълнителя (Нова)

Създава се нова под-кlausа 6.12 със следното съдържание:

“Изпълнителят може да наеме за своя сметка чуждестранен персонал, необходим му за извършване на отделни видове СМР. Той трябва да осигури всички необходими документи за узаконяване на пребиваването, престоя и работата на този персонал в съответствие с изискванията на българското законодателство.”

6.13 Ключов персонал на Изпълнителя (Нова)

Създава се нова под-кlausа 6.13 със следното съдържание:

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Здравейте
Областен съвет
ОРЗД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

„Изпълнителят е длъжен да осигури ключовия персонал за изпълнение на Договора съгласно офертата му, като осигури присъствието на съответните експерти по време на изпълнението съгласно конкретните им функции и отговорности.

Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя.

Изпълнителят трябва, по своя инициатива, да предложи смяна на ключов експерт, когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на задълженията на дадено лице.

В този случай Изпълнителят дава на Възложителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт. С това уведомление Изпълнителят предлага експерт, който да замени досегашния ключов експерт, като посочи квалификация и професионален опит на новия експерт, които задължително следва да са еквивалентни на минимално изискуемите съгласно изискванията на Възложителя за конкретната позиция, като приложи доказателства за това.

Възложителят може да приеме замяната или може мотивирано да откаже предложени експерт.

В случай, че Изпълнителят ползва подизпълнители и трети лица, следва да се спазват разпоредбите на чл. 66 от ЗОП.“

7 ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ И ИЗРАБОТКА

7.1 Начин на изпълнение

В края на тази под-клауза се създават нови параграфи със следното съдържание:

„Използването на употребявани/стари материали и оборудване за целите на изпълнение на Договора е недопустимо, освен в случаите на използване на сертифицирани рециклирани материали, когато нормативната уредба предвижда използването на такива (Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.).


Изпълнителят трябва да представя на Инженера документи за съответствие спрямо изискванията на Възложителя на оборудване, продукти и материали преди влагането им в строежа; документите трябва да са съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Възложителят едностранно по всяко време може да преглежда тези документи, да изисква проверка за съответствието на материалите спрямо тях, вкл. чрез лабораторни и други изследвания. Всякакви разходи в тази връзка без ограничение са за сметка на Изпълнителя. Възложителят, в резултат от последното или на други основания, може да отказва влагането на тези материали, вкл. заплащането им.”

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНЕДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

8 ЗАПОЧВАНЕ, ЗАКЪСНЕНИЯ И ПРЕКЪСВАНЕ

8.1 Започване на работа

Първи параграф се променя както следва:

“Датата на започване е 7 дни след датата на получаване на уведомително (възлагателно) писмо на Възложителя за започване на изпълнението. Възможно е получаването на няколко подобни писма (например в случай на въвеждане на етапност в строителството), без това да влияе върху цялостното време за завършване.“

8.3 Програма

В първи параграф, думите „28 дни“ се заменят с „14 дни“.

В края на точка (а) се добавя: „включително процедури за предаване на обекта в съответствие с действащото законодателство“.

В буква (d) към първия параграф се добавя следната буква:

(iii) Подробен План на паричните потоци, съобразен с Линейния график

След втория параграф се добавя нов параграф със следния текст:

“При представяне на проектната документация, Изпълнителят ще разработи подробни "План за организация и изпълнение на СМР", "План за безопасност и здраве" според предвидените изисквания за получаване на разрешение за строеж съгласно действащото българско законодателство и "План за опазване на околната среда". При необходимост, след одобряването им, Изпълнителят ще направи промени в първоначално представената Програма.”

Последният параграф на под-клауза 8.3 се променя както следва:

„Изпълнителят ще вземе предвид, че климатичните условия (в това число отрицателни температури, зимни, пролетни и есенни валежи и др.) могат да ограничат дейностите на обекта. Програма, която отчита тези обстоятелства чрез ограничаване или временно спиране на определени дейности, ще бъде приемлива, но не може да освободи Изпълнителя от задълженията за завършване на обекта в рамките на посоченото в Договора време за завършване, освен ако не се процедира удължаване поради установено наличие на изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно Договорния ред.

Ако по някое време Инженерът даде съобщение до Изпълнителя, че работната програма не успява (до посочената степен) да се придържа към Договора или да е в съответствие с действителния напредък и оповестените намерения на Изпълнителя, Изпълнителят трябва да представи на Инженера за преглед и одобрение реалистична ревизиран ^{Възложителя} ^{ОПРЗ} ^{предвиждаща} съответните коригиращи действия.

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Ревизираната работна програма на Изпълнителя не може да надхвърля Времето за завършване, освен когато не са налице установени от страните обстоятелства извън отговорността и добрата грижа на Изпълнителя.“

8.4 Удължаване на Времето за Завършване

Удължаване на времето за завършване може да бъде осъществявано само по реда на Договора и при наличие на съответните правни и фактически основания. В случай, че същият е спазен и такива са налични, то не е необходимо подписване на допълнително споразумение към Договора.

8.5 Закъснения, причинени от властите

Крайт на параграфа се заличава и заменя със следния текст:

„то тогава закъснението или разстройването ще се считат за причина за забава и Изпълнителят може да претендира вреди по общия ред, а не по силата на настоящия договор.“

8.6 Темп на напредъка

Накрая на под клаузата се добавя следният текст:

„Ако Инженерът или Възложителя констатират, че при вече дадено съобщение от Инженера, Изпълнителят не предприеме ревизиращите методи и не ускори темпа като коригиращи действия, Инженерът (вкл. по инструкция на Възложителя, която е със задължителен характер) може да пристъпи към удържане на сума съгласно под-клауза 14.6 Издаване на Актове за Междинни Плащания и посоченото в Приложението към офертата. Удържаните суми подлежат на възстановяване на Изпълнителя, във всеки случай от следните хипотези:

1. При компенсиране от Изпълнителя на изоставането, което е дало основание за удържката;
2. Изпълнителят е завършил обекта в рамките на времето за завършване.“


8.7 Обезщетение за забава

Накрая се добавя следното изречение:

„От общия размер на неустойката за забава, начислена съгласно настоящата под клауза, се приспадат неустойките, наложени съгласно под клауза 8.6, ако има такива.“

8.8 Прекъсване на работа


Първото изречение се заменя със следното:



Заличени данни
съгласно чл. 71
0132



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

„Инженерът може, по всяко време, да нареди на Изпълнителя да прекъсне изпълнението на Обекта, съгласно реда на действащото законодателство. За времето на прекъсването, Изпълнителят е длъжен да обезопаси и съхрани Обекта.”

9 ПРОБИ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ

9.1 Задължения на Изпълнителя

Вторият параграф се изменя както следва:

„Изпълнителят трябва да даде най-малко 14-дневно предизвестие до Инженера, Проектанта и Възложителя, за датата, след която Изпълнителят ще бъде готов да проведе всяка една от Пробите при Завършване”.

Третият параграф, подточка (с) се допълва както следва:

„72-часова пробна експлоатация, която трябва да покаже, че Обектът работи надеждно и в съответствие с Договора.”

Четвъртият параграф се изменя както следва:

„След 72-часовата пробна експлоатация, ако Обектът работи при устойчиви условия и е подписан Протокол Образец 17 за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, Изпълнителят трябва да съобщи на Инженера дали Обектът е готов за проби за доказване на експлоатационните параметри, които да покажат дали Обектът отговаря на критериите, точно определени в Изискванията на Възложителя и Офертата на Изпълнителя.”

9.4 Неуспех на пробите при завършване

Вторият параграф се заличава.

Подточка б/ се променя както следва: „нареди повторно изпълнение на Обекта, за който не са преминали успешно пробите.“

Подточка с/ и вторият параграф се заличават.

10. ПРИЕМАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10.1 Сертификат за приемане на Обекта

В първи параграф се заличава изразът: “...но с изключение на описаното в буква (а) по-долу...”

Текстът на буква (а) и се променя, както следва:

„(а) прегледа техническата документация: проекти, разрешения, ексекүтивна документация, актове и протоколи, съставени по време на строителство, дневници, дек

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК ООД – Русе”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г”. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК” ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

на вложените строителни продукти, изпитвания и измервания, заповедна книга, протоколите от изпитвания и др. доказващи правилността на изпълнението;

(b) прегледа изпълнението на строежа, състоянието на строителната площадка и околното пространство и разпорежи при нужда комплексни изпитвания;

(c) информира със 7-дневно предизвестие Възложителя, Изпълнителя, включително проектантите по всички части, за насрочване на среща за преглед на строителните книжа и оглед на обекта подписване на КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване годността за приемане на строежа съгласно Приложение No 15 към НАРЕДБА No 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.”

Буква (b) се променя на буква (d), като текстът се запазва.

Четвъртият параграф се замества със следния:

„Когато страните в инвестиционния процес подпишат КОНСТАТИВНИЯ АКТ Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа и Изпълнителят даде предизвестие до Инженера съгласно под-клауза 9.1 [Задължения на Изпълнителя], и преди да издаде Сертификат за приемане по смисъла на Клауза 10, Инженерът се задължава да подготви от името на Възложителя уведомителни писма до съответните специализирани контролни органи, и когато получи разрешения за 72-часова проба от всички държавни контролни органи, да подготви свикване на комисия, която ще състави Протокол Образец 17, за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия към НАРЕДБА No 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.”

Създава се нов пети параграф:

„След подписване на АКТ Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа и подписване на Протокол Образец 17, за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия Инженерът ще издаде Сертификат за приемане по смисъла на Клауза 10. Издаването на Сертификат за приемане, на тази база съставлява приемане съгласно Клауза 10 [Приемане от Възложителя].”

10.2 Приемане на части от обекта

Цялата клауза се заличава.

10.3 Пречки при проби при завършване

Текстът на под-клаузата се заличава и се заменя със следния:



----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНАДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

„Ако Изпълнителят бъде забавен и/или прави допълнителни Разходи в резултат от това забавяне в провеждането на Изпитанията при Завършване, Изпълнителят трябва да уведоми Инженера и съгласно Под-Клауза 20.1 [Искове на Изпълнителя] ще получи право на удължаване на срока за всяко такава забавяне, ако завършването е или ще бъде забавено, по силата на Под-Клауза 8.4 [Удължаване на Срока за Завършване].

След получаване на това уведомление, Инженерът трябва да процедира в съответствие с Под-Клауза 3.5 [Решения], за да съгласува или вземе решение по тези въпроси.”

10.5 Разрешение за ползване (Нова)

„В срок от 56 дни от издаване на Сертификат за приемане, Инженерът се задължава, в качеството на упълномощено от Възложителя лице, да внесе Искане за издаване на разрешение за ползване до ДНСК, като предварително изготви Окончателен доклад на строителния надзор и подготви всички други документи съгласно чл.4 ал.2 НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В случай, че държавната приемателна комисия откаже да приеме строежа или направи забележки, по причини, които не могат да бъдат вменени като отговорност на Изпълнителя, Инженерът ще даде разпоредения по реда на Клауза 13 [ПРОМЕНИ И КОРЕКЦИИ]. Изпълнителят се задължава, да поправи за своя сметка всички дефекти които могат да бъдат вменени като негова отговорност по реда на Клауза 11 [ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТИ].”

11 ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТИ

11.3 Удължаване на срока за съобщаване на дефекти

В края на първия параграф се добавя следният текст:

„Периодите, в които Обектът е неизползваем или работата е сериозно повлияна в резултат на вина или щета, за която Изпълнителят носи отговорност в съответствие с под клауза 11.1, следва да бъдат изключени от Срока за съобщаване на дефекти, който трябва да бъде удължен със съответния период от време.“

11.8 Изпълнителят да търси

Под-клаузата се променя както следва:

„Ако бъде поискано от Инженера, след предварителното одобрение от Възложителя, Изпълнителят ще търси причината за всеки дефект под ръководството на Инженера. Освен когато дефектът подлежи на поправяне за сметка на Изпълнителя съгласно Под-Клауза 11.2 [Разходи за Поправяне на Дефекти], разходите за такова търсене и поправяне ще бъдат включени в Договорната Цена, но само в случай че отговарят на всички разпоредби на Клауза 11 [ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТИ] И КОРЕКЦИИ].”

*Замени данни
съгласно стр. 4,
0137*

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

11.9 Сертификат за изпълнение

Накрая се добавя нов параграф:

„Издаването на "Сертификат за изпълнение" не освобождава Изпълнителя от отговорностите му през гаранционния период, определен по силата на действащото законодателство.”

13 ПРОМЕНИ И КОРЕКЦИИ

13.1 Право да променя

В края на под-клаузата се добавя следният текст:

„Измененията и допълненията към настоящия Договор се извършват съгласно разпоредбите на чл. 116 от ЗОП. Промените следва да са съобразени с предвижданията на клаузите на Договора, включително клаузи за изменение на срока, цената и проекта. Обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват, не следва да водят до промяна в предмета на поръчката. Всяко нареждане за промяна, следва да съдържа фактическа и правна обосновка за допустимостта на промяната, с оглед клаузите на договора и разпоредбите на чл. 116 от ЗОП. Преди влизане в сила на нареждането за промяна обосновката подлежи на преглед от Възложителя. Той има право да не приеме обосновката или да изиска нейното изменение или допълнение. Нарездането от страна на Инженера може да се извърши единствено след приемане на обосновката от страна на Възложителя (вкл. приемане на всяко от действията, произтичащи от под-клауза 13.3) като той има възможност да отхвърли изцяло или частично предложението за промяна и/или нареждането без това да бъде основание за Изпълнителя да прилага други части от Договора.“

13.2 Рационализация

Заличава се.

13.3 Процедура за промяна

В първия параграф, буква (с) се заменя със следния текст:

(с) предложението на Изпълнителя за оценяване на Промяната и обосновка за усвояване на провизорни суми (в случаите, когато за Промяната се използват средства от провизорните суми).

Накрая се добавя следният текст:

„Измененията на инвестиционния проект се допускат по реда на Закона за устройство на територията. Същественият отклонения от одобрения инвестиционен проект, дефинирани в чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, се допускат по смисъла на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж, като се отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им. Несъщественият отклонения от одобрения инвестиционен проект - всички отклонения извън

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

посочените в чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, се допускат след нареждане от Проектанта на Обекта в Заповедната книга на Обекта.

Изменения на срока на договора, свързани с удължаване на времето за завършване, се допускат съгласно под клауза 8.4 Удължаване на Времето за Завършване.

Изменения на договорната цена се допускат съгласно под клауза 13.5 Провизорни суми, под клауза 13.7 Корекции при промени в законодателството и под клауза 13.8 Корекции при промяна в разходите.

Когато Инженерът издава заповед или предписание до Изпълнителя, съставляващо промяна по смисъла на под-клауза 13.1, Инженерът се задължава да поиска предварително предложение от страна на Изпълнителя, остойностяващо всички възможни последващи разходи и рискове при изпълнение, след което да получи и предварителното одобрение от страна на Възложителя. Заповеди за промяна, които не са предварително записани в заповедната книга от оправомощените по закон лица (вкл. Възложителя или негов упълномощен представител), а когато са издадени от Инженера не са били предварително съгласувани с Възложителя, не подлежат на изпълнение и не подлежат на заплащане по Договора.

13.4 Плащане и приложими валути

Под-клаузата се заличава.

13.5 Провизорни суми

Първото изречение на под-клауза 13.5 се заменя със следното:

„Договорната Цена може да бъде коригирана, за сметка на провизорните суми, заложиени като част от приетата от Възложителя договорна сума.

Всяка Провизорна сума трябва да се използва, частично или изцяло, според указанията на Инженера и след предварителното съгласие на Възложителя, само за работа, възникнала на основание под-клауза 13.1 Право да променя и само след като са спазени изискванията на под-клауза 13.3 Процедура за Промяна, като промяната следва да е съобразена с разпоредбите на чл. 116 от ЗОП като не е необходимо подписване на допълнително споразумение към Договора.“

13.7 Корекции при промени в законодателството

Под-клаузата се заличава.

13.8 Корекции при промяна в разходите

Текстът на под-клаузата се заменя със следния текст:

„Цените по Таблиците не се променят при промени в цените на труда, строителните продукти, оборудването и др., освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.“

Валидни данни
Съгласно ЗЛ ЧОПЗД

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНА МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

13.9 Процедура за допълнително възлагане (нова)

При необходимост от възлагане на допълнителни работи и при изчерпване на допустимия размер на провизорните суми по настоящия Договор, допълнителните работи се възлагат в съответствие с условията на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

14 ДОГОВОРНА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

14.1 Договорната Цена

В точка (а) се заличава текстът: „и да подлежи на корекция в съответствие с Договора.“

14.2 Авансово плащане

Третият параграф се замества от следния текст:

„Инженерът трябва да издаде "Акт за междинно плащане" за авансовото плащане, след получаването и одобряването на (i) "Програмата" съгласно Под-Клауза 8.3 [Програма] и (ii) обезпечение за авансово плащане.

Гаранциите за авансово плащане се предоставят в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

В случай, че Участникът представи като обезпечение на авансовото плащане банкова гаранция или застраховка, същата следва да е с валидност не по-малко от 28 дни след издаване на Сертификата за приемане.“

Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства ще се освободи от Възложителя до 3 дни след възстановяване на аванса от страна на Изпълнителя.“

14.3 Заявяване на актове за междинно плащане

В първия параграф текстът „отчет в шест екземпляра“ се заменя с текста "отчет в три екземпляра" В под-клаузата думата „месец“ се заменя с „период“.

В края на под-клаузата се добавя следния параграф:

„Допуска се отчитането на постоянните работи, свързани с възстановяване на уличната настилка, да се извършва в съотношение 80:20 в полза на работите извън възстановяване на настилка. В допълнение, работите по полагане на неплътен и плътен асфалтобетон също е допустимо да се отчитат в съотношение 50:50 за отделните видове асфалтобетон.“

14.4 График на плащанията


----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Валиден датум
съгласно Ст. 4 ОПС



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНАДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Текстът на под-клаузата се заличава и се заменя със следния:

„Изпълнителят, в рамките на максимум 28 дни след подписването на Договора, трябва да осигури на Инженера и на Възложителя подробна оценка на паричните потоци, въз основа на линейния си график от офертата (или актуализиран график в процеса на изпълнение на Договора) за всички плащания, които са му дължими. Последователно, на всеки месец (допуска се да бъде като част от месечния отчет) или по изискване на Инженера, Изпълнителят трябва да осигурява ревизирана оценка на паричните потоци.”

14.5 Механизация и материали, предназначени за работите

Във втория параграф изразът „Ако списъците, посочен в подточки (b)(i) или (c)(i) по-долу не са включени в Приложението към Офертата, настоящата Под-Клауза няма да се прилага” се заличава.

Към параграф трети, буква „а“ се създава нова точка (iii) със следния текст:

„е представил в полза на Възложителя безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на стойността на съответното Технологично Оборудване и Материали, издадена във форма и от банка, одобрени от Възложителя; „

Съюзът „или” след параграф (iii) буква „а“ се заличава и заменя с „и“

Съществуващият текст на буква „b” се заличава. Създава се нова буква (b) със следния текст:

„(b) съответните Технологично Оборудване и Материали

(i) са тези описани в Офертата, когато бъдат доставени на Площадката, и

(ii) са били доставени до и се съхраняват по подходящ начин на Площадката, защитени са срещу загуба, повреда или разрушаване и изглеждат да са в съответствие с Договора.

(iii) са в съответствие с Техническите спецификации;

(iv) са тези, за които Изпълнителят е водил задоволителни отчети (включително ордери, квитанции, разходи и ползване на Технологично оборудване и Материали), съгласно указанията дадени от Инженера и които са били предоставени за преглед от Инженера;

(v) са тези, за които Изпълнителят е представил в месечните си отчети изисквани от Инженера доказателства за собствеността на съответното Технологично Оборудване и Материали и извършените за тях плащания;

(vi) са тези, за които Изпълнителят има всички документи удостоверяващи, че те са негова собственост;”

Банковата гаранция по параграф 3, буква а, т.3 се освобождава от Възложителя при влагането на материалите и оборудването в обекта и сертифициране на изпълнените СМР съгласно под клауза 14.6.“

Съществуващият текст на буква (с) и буква „с” се заличават.

14.6 Издаване на актове за междинни плащания

След края на първия параграф се добавя нов втори параграф със следното съдържание:

Заличени датчи
съгласно чл. 40ФЗД

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Русе”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК” ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНЕДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

„Когато Инженерът открие грешка в Отчета или помощните документи, той ще има право да ги върне на Изпълнителя за поправка, а времето за издаване на Акт за междинно плащане и срокът за плащане ще се счита, че започват да текат от датата на повторното предаване от Изпълнителя на Отчета. Това правило ще се прилага и по отношение на Акта за окончателно плащане.”

Накрая на под-клаузата се добавя следният текст:

„Инженерът може от всеки Акт за междинно плащане да удържи сума, посочена в Приложение към офертата, при констатирано забавяне в програмата за изпълнение съгласно под-клауза 8.6 Темп на напредък.

Инженерът може от всеки акт за междинно плащане да удържи сума съгласно последния параграф на под-клауза 4.18 Опазване на околната среда, във връзка с направени от Възложителя разходи, при спазване на условията, посочени в под-клауза 4.18.

Отчетите на Изпълнителя включват и всички изискуеми документи съгласно Закона за устройство на територията и всички други свързани с това законови и подзаконови нормативни актове“.

14.7 Плащане

Текстът на буква (b) от параграф 1 „получи Отчета и придружителните документи“ се заменя с „издаде Акт за междинно плащане“

Накрая се добавят следните нови параграфи:

„Възложителят има право във всеки Акт за междинно плащане да внесе поправки или изменения в съответствие с приложимите правила за допустимост на разходите.

Всички плащания ще се извършват не по-рано от 14 дни от предаването от Изпълнителя на данъчна фактура, съответстваща на одобрения от Инженера Акт за плащане или след извършване на поправките и измененията съобразно предходния параграф. Датата, на която се задължава сметката на Възложителя, се приема за дата на плащането.”

14.8 Забавено плащане

Текстът на под-клаузата се заличава.

14.9 Изплащане на задържани пари

В края на първия параграф, се добавя следният текст:

Заличено датни
съгласно чл. 4 ВРЗ

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ

ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

„Втората половина от Задържаните пари се заверява след изричното одобрение на Възложителя (например във връзка с изтичане на периода за допустимост на разходите по ОПОС) от Инженера за изплащане на Изпълнителя едновременно с първата половина или преди изтичане на Срока за съобщаване на дефекти, срещу банкова гаранция за същата сума със срок на валидност не по-малко от датата на издаване на Сертификата за изпълнение след изтичане на Периода за отстраняване на дефекти. В случай, че валидността на банковата гаранция изтича преди осъществяването на горните условия, Изпълнителят се задължава да представи нова банкова гаранция до 21 дни преди изтичането на валидната гаранция, отговаряща на сроковете по Договора, като между сроковете на валидност на двете гаранции не следва да има прекъсване. Гаранцията се освобождава едновременно с издаване на (последния от) Акта(овете) за окончателно плащане.

14.10 Отчет при завършване

Текстът в първи параграф : „В рамките на 84 дни след ... ” се заменя с : „ В рамките на 42 дни след ... ”

Текстът в първи параграф: „..... шест екземпляра ... ” се заменя с „ ...три екземпляра... ”

14.11. Заявяване на акт за окончателно плащане

В първи параграф думата „шест“ се заменя с „три“.

Текстът в първи параграф: „В рамките на 56 дни след ... ” се заменя с : „В рамките на 28 дни след ... ”

14.12 Уреждане

Второто изречение на под-клаузата се заличава.

14.15 Валуты за плащане

В края на под-клаузата се добавя следният текст:

„Плащания ще се извършват в български лева по банковата сметка на Изпълнителя. В случай, че настъпи изменение в данните относно банковата сметка, то Изпълнителят има задължение да уведоми Възложителя в 7-дневен срок след настъпване на изменението.”

Денят, в който сметката на Възложителя се дебитираща, следва да се счита за ден на плащането.,,

14.16 Специфични правила (нова)

„Преди издаването на фактури, Изпълнителят, ако е чуждестранно лице, ще се регистрира в Държавата за целите на корпоративно данъчно облагане или за целите на облагане с Данък добавена стойност" (ДДС), доколкото и както се изисква от Закона в Р България


----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Заклучени данни
- Стова данно
10P52



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНЕДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Изпълнителят се задължава да открие отделна банкова сметка за получаване на плащанията от Възложителя по този договор и всеки месец да представя банково извлечение от откритата сметка.

Изпълнителят се задължава да издава фактури на Възложителя в български лева, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание, и по-специално фактурите да съдържат следния, текст, който ще бъде уточнен преди издаване на първата фактура.

14.17 Разплащане с подизпълнители (Нова)

„Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по описания ред.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.“

15 ПРЕКРАТЯВАНЕ, РАЗВАЛЯНЕ И/ИЛИ УНИЩОЖАЕМОСТ НА ДОГОВОРА (Нова)

Текстовете на Клаузи 15 и 16 се заличават и се заместват със следния текст:

15.1 Предупреждение да се поправи

Ако Изпълнителят пропусне да изпълни което и да е задължение, Инженерът или Възложителят могат да дадат предупреждение до Изпълнителя, изисквайки от него да отстрани пропуската и да го поправи в рамките на точно определен разумен срок.

15.2 Прекратяване действието на договора

„Настоящият договор прекратява действието си при следните обстоятелства:


1. С неговото изпълнение;
2. По взаимно съгласие на страните;
3. В случай, че в договорения срок от подписването на настоящия договор, не е осигурено финансиране от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., за което обстоятелство Изпълнителят е уведомен от Възложителя, всяка от страните може да прекратяване

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.


Заклучен датум
02.11.2015 г.
40/15



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНАДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

без предизвестие. Страните могат да се позовават на настоящата клауза за прекратяване, но не по – рано от изтичане на 3 /три/ месеца от сключването на Договора съгласно условията на чл. 114 от ЗОП.

4. При прекратяване или разваляне на Договора при условията на Под-клаузи 15.3 и 15.4 по-долу;

15.3 Прекратяване от Възложителя

Възложителят може да прекрати действието на договора с едностранно писмено изявление до Изпълнителя във следните хипотези:

1. Когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява Договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
2. В случай, че се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката, за Изпълнителя, в качеството му на участник, са били налице обстоятелства, които съобразно разпоредбите на действащия към откриването ѝ Закон за обществените поръчки, са представлявали основания за задължителното му отстраняване от процедурата;
3. Ако се установи, че поръчката, по която е сключен настоящия договор, не е следвало да бъде възложена на Изпълнителя по този договор, поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС;
4. Ако стане явно, че Изпълнителят няма да може да изпълни в срок работата или че няма да я изпълни по уговорения или надлежен начин, поради причини, за които Изпълнителят отговаря, Възложителят може да прекрати договора, като има право на обезщетение по общите правила на ЗЗД;
5. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложения предмет по договора, включително ако са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предизвика, да предвиди и/или предотврати, същият прекратява договора с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. При лишаване на Изпълнителя от правоспособност да изпълнява дейностите, съставляващи предмет на Договора;
7. При обявяване на ликвидация или изпадане в неплатежоспособност на Изпълнителя;
8. При констатирани нередности или конфликт на интереси от страна на Изпълнителя;

В случаите на прекратяване на настоящия договор по т. 2, 3, 4, 6, 7 и 8 Възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на Договора.

15.4 Разваляне на договора

Когато страна по настоящия договор не изпълни задължението си поради причина, за която същата отговаря, насрещната страна може да развали Договора, като предостави разумен срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането му, настоящият договор ще се смята за развален.


www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПООС 2014-2020 г.


Замислен датум
Следва да се чете



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Предупреждението трябва да се направи писмено и по начин, който да удостоверява датата на получаване на изявлението от неизправната страна /нотариална покана, входиране на писмото в деловодството на неизправната страна, изпращане по куриер или с препоръчано писмо с обратна разписка, или други подходящи форми/.

Възложителят може да заяви писмено на Изпълнителя, че разваля договора, без да е длъжен да му предостави допълнителен срок за изпълнение, ако изпълнението е станало невъзможно изцяло или отчасти, поради забава на Изпълнителя, която е довела до отпадане на необходимостта за неговото изпълнение.

Разваляне на договора в горепосочените хипотези е недопустимо в случай, че неизпълнената част от договора е незначителна с оглед на интереса на Възложителя.

Ако изпълнението е станало невъзможно поради наличие на изключителни и/или непредвидени обстоятелства, включително и ситуация на криза по смисъла на тълкуването на понятията съгласно Закона за обществените поръчки, това не води до разваляне на договора по този ред.

Когато в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, някоя от страните не е в състояние да изпълни своите задължения, неизправната страна дължи обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

Във всички случаи, разпоредбите на настоящата Под-клауза се прилагат в случай, че неизпълнението на договора от която и да е от страните по него е виновно, респективно дължи се на причини, за които неизправната страна отговаря.

15.5 Действия след прекратяването

В случай на прекратяване на Договора Изпълнителят трябва да освободи площадката и да предаде на Възложителя всички доставени материали, оборудване и обзавеждане за Обекта, заповедната книга, всички строителни книжа и цялата останала проектна документация, изработена от или за него. Независимо от това, Изпълнителят трябва да положи всички разумни усилия, за да изпълни незабавно всички уместни нареждания, съдържащи се в съобщението: (а) за прехвърляне на който и да е подизпълнителски договор и (б) за опазване на живот или имущество или за сигурността на Обекта.

Веднага щом като стане възможно след като едно съобщение за прекратяване съгласно Под-Клауза 15.3 [Прекратяване от Възложителя] влезе в сила, Инженерът трябва да процедира в съответствие с Под-Клауза 3.5 [Решения], за да договори или определи стойността на Обекта, Стоките и Документите на Изпълнителя, и всички други суми, дължими на Изпълнителя за работата, изпълнена в съответствие с Договора.

15.6 Други разпоредби

www.eufunds.bg


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Съгласно условията на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки, следва да се има предвид, че страните по настоящия договор могат да се позовават на неговата унищожаемост, съблюдавайки специалните норми на Закона за обществените поръчки, предвид сключването на договора в условията на закона.

За всички неуредени въпроси в настоящия договор и в Закона за обществените поръчки, свързани със сключването, изпълнението и прекратяването на настоящия договор се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.“

17 РИСК И ОТГОВОРНОСТИ

17.3 Рискове на Възложителя

Заличава се буква g).

18 ЗАСТРАХОВКА

18.1 Общи изисквания към застраховките

Текстът на под клаузата се заменя със следния текст:

„Застрахователна страна ще бъде Изпълнителят съгласно съответните под клаузи на Договора.

Изпълнителят носи отговорност и се задължава да обезщети Възложителя, за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по Договора.

Изпълнителят носи отговорност и се задължава да обезщети Възложителя, за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с материални вреди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по Договора.

Изпълнителят трябва да поддържа застраховките валидни, за да осигури покритие до датата на срока по настоящия Договор, за загуби и щети, настъпили по вина на Изпълнителя и такива, причинени от Изпълнителя в хода на всички други операции, включително тези в периода на съобщаване и отстраняване на дефекти.

Разходите по обслужване на застраховките са за сметка на Изпълнителя, като застрахователните премии трябва да бъдат изплатени изцяло на застрахователя при подписване на застрахователния Договор.


СОФИЯ
Заличане датум
Обгласено ел.чорба

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНАДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Изпълнителят е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховките, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

Възложителят има право да поиска представянето от Изпълнителя на застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на застрахователните премии по дължимите застраховки, като Изпълнителят се задължава да ги предостави на Възложителя в 7-дневен срок от получаването на направеното искане.

18.2 Застраховка на Обекта и строителната механизация на Изпълнителя

Под-кlausата се заменя изцяло с нов текст, както следва:

„Изпълнителят, като застраховаща страна, трябва да застрахова Обекта, Технологичното Оборудване, Материалите и Документите на Изпълнителя, като застраховката следва да покрива като минимум разходите за пълно възстановяване, включително разходи за разрушаване, премахване на отпадъците, професионални хонорари и печалба.

Изпълнителят може да застрахова обекта постапно, съобразно нарастването на текущата стойност на закупеното Технологично Оборудване и Материали.

Застраховката на обекта трябва да влезе в сила от дата не по-късно от 21 дена след датата на започване и да бъде поддържана валидна до датата на издаване на Сертификата за Приемане на Обекта.

Застраховащата Страна трябва да поддържа тази застраховка, за да осигури покритие до датата на издаване на Сертификат за Изпълнение, за загуби и щети, настъпили по вина на Изпълнителя, по вина на трети лица, или поради непреодолима сила, възникваща преди издаването на Сертификата за Приемане и за загуби и щети, причинени от Изпълнителя в хода на всички други операции (включително тези съгласно Клауза 11 [Отговорност за Дефекти] и Клауза 12 [Проби след Завършване]).

Застраховките по настоящата под клауза трябва да бъдат сключени и поддържани от Изпълнителя като застраховаща Страна, трябва да покриват всички загуби и щети поради която и да е причина в Под-Клауза 17.3 [Рискове на Възложителя].”

18.3 Застраховка срещу злополуки с лица и щети върху имущество

Под-кlausата се заменя изцяло с нов текст, както следва:

„За времетраенето на Договора, Изпълнителят се задължава да поддържа валидни застраховки за покриване на пълната му професионална отговорност, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./. Размерът на застраховката е посочен в Приложението към Офертата. Тези застраховки следва да се поддържат валидни от Изпълнителя, до изтичане на периода за съобщаване на дефекти.”

*Заличени документи
Създадени от: С. Орман*

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

19 ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Цялата клауза се заменя със следния текст:

„Изключителни обстоятелства са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно-установени дейности на Възложителя. Непредвидени обстоятелства са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на възникването на обстоятелства по първи параграф, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

Ако страните са били в забава преди възникването на обстоятелства по първи параграф те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по договора.

Не е налице обстоятелство по първи параграф, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то тя е могла да бъде преодоляна.

Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от обстоятелство по първи параграф, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването му, съответно – за преустановяване въздействието му. Тя е длъжна да представи във възможно най-кратък срок документ, удостоверяващ наличие на обстоятелства по първи параграф, издаден от компетентен орган, когато такъв се изисква със закон.

Когато обстоятелствата по първи параграф възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от обстоятелства по първи параграф, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането им.

След отпадане на обстоятелствата по първи параграф, страната, която е дала известието по шести параграф, в пет дневен (5) срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

Ако след изтичане на петдневния (5) срок, страната, която е дала известието по шести параграф, не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПООС 2014-2020 г.

*Заличени данни
съгласно чл. 4 ОРЗД*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от пет (5) дни.

Ако и след изтичане на срока, определен в известието по осми параграф, страната, която е дала известието по шести параграф, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от обстоятелства по първи параграф, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по четвърти параграф.“

20 ИСКОВЕ, СПОРОВЕ И АРБИТРАЖ

20.1 Искове на Изпълнителя

В края на под-клаузата се добавя следният текст:

„Събитие или обстоятелство, имащо продължително действие е такова, чиято продължителност е 28 или повече дни“.

20.5 Приятелско разрешение

Текстът на под клаузата се променя както следва:

„Когато по силата на горната Под-Клауза 20.4 е дадено съобщение за незадоволство, двете Страни трябва да направят опит да разрешат спора приятелски преди започването на съответните производства по под клауза 20.6. Все пак освен ако двете Страни не решат друго, съответните производства по под клауза 20.6. може да бъдат започнати на или след петдесет и шестия ден след деня, на който е било дадено съобщение за незадоволство, дори и ако не е бил направен опит за приятелско разрешение.“

20.6 Арбитраж – под клаузата се заменя с под клауза 20.6 Разрешаване на спорове

„Освен ако бъде разрешен приятелски, всеки спор, по отношение на който решението на КРС (ако има такова) не е станало окончателно и обвързващо, трябва да бъде окончателно разрешен от компетентен съд.“

20.7 Пропуск да изпълни решение на Комисията за разрешаване на спорове

Текстът на под клаузата се променя както следва:

Последният параграф се променя както следва:

„то в такъв случай другата Страна може, без ущърб на които и да са други права каквито тя може да има, сама да отнесе неизправността за решаване на спора по реда на




Замисли дати
Съгласно ст. 40РЗ

www.eufunds.bg


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Клауза 20.4 [Получаване на Решение на Комисията за Разрешаване на Спорове], и Под-Клауза 20.5 [Приятелско Решение] няма да се прилагат в тази връзка.“

20.8 Изтичане на назначението на Комисията за разрешаване на спорове

Текстът на буква (b) се променя, както следва: „спорът може да бъде отнесен за решаване по реда на под клауза 20.6.“

20.9 Споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството (Нова)

„Споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията по чл.169, ал. 1 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, се решават от лицето, упражняващо строителен надзор, и от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна".

При спорове:

а/ решението на лицето, упражняващо строителен надзор за строежа, е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа;

в/ отмяна на техническо решение, предписание, заповед на лицето, упражняващо строителен надзор, може да бъде поискана от заинтересуваната страна в 7-дневен срок от подписване на протокол за разногласие, внесен в регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК); началникът на РДНСК се произнася в 7-дневен срок.”

21 КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО (Нова)

„Извършването на СМР, както и всички Материали и Технологично оборудване, следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Договора и приложимото законодателство. Неспазването им от Изпълнителя ще се счита за неизпълнение на Договора, което ако е системно или представлява съществено неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на Договора от Възложителя съгласно клауза 15 [Прекратяване, разваляне и/или унищожаване на Договора].

Контролът на качеството на работите и на строителните продукти се извършва:

1. от Инженера при осъществяване на непрекъснат надзор по време на изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и в съответствие с договора на Инженера с Възложителя;
2. от Проектанта, при изпълнение на авторски надзор;
3. от Възложителя – чрез съответното си Звено за управление на проекта или по друг ред, произтичащ от Договора или съгласно писмено едностранно волеизявление от страна на Възложителя към другите участници в строителството.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обхващаща дн. „ВиК ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

По всяко време в хода на строителството Възложителят има право на достъп до Строителната площадка и Строежа за контролиране на прогреса и качеството на СМР, както и да изисква:

1. писмени и устни обяснения от Изпълнителя и неговите служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;
2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на Изпълнителя (включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни споразумения, доклади и актове по изпълнение на Договора и др.)“

22 ОДИТ (Нова)

„При проверки на място от страна на Възложителя, /Управляващия орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската комисия, Изпълнителят осигурява присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности. Изпълнителят представя на българските и европейските одитиращи органи при поискване доказателства за условията, при които се изпълняват този договор.

Изпълнителят се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място.”

23 НЕРЕДНОСТИ (Нова)

„Изпълнителят се задължава да запознае своите служители с определението за „нередност“ и „измама“, както и да докладва за възникнали нередности пред Възложителя съгласно утвърдената от Възложителя процедура за работа с нередности - по смисъла на този договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба на правото на ЕС, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, който има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.

Изпълнителят се задължава да възстановява суми по нередности, установени по надлежния ред като резултат от изпълнение на дейностите на Изпълнителя по този Договор и други неправомерно получени средства, заедно с дължимата законна лихва от датата на получаването им.

Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи, свързани с установени нередности, в срок до 31 август 2020 г., а след получаване на писмено уведомление от Възложителя и в по-дълъг срок, съгласно предвиденото в уведомлението.


Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или

*Възникнали данни
съгласно в.ч.ОПЗ*

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи на Възложителя.

Изпълнителят се задължава да уведоми всички свои служители, работещи по изпълнението на договора, относно определението за нередност и да ги задължи да докладват всеки случай на подозрение и/или доказани случаи на нередност съгласно установена процедура от Възложителя. При подписване на този договор, Изпълнителят декларира, че всички негови служители са запознати с определението за нередност.”

24 ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ (Нова)

„Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и комуникация по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., както и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020“.

25 АРХИВИРАНЕ (Нова)

„Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за архивиране по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“.

26 ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ ПО ДОГОВОРА (Нова)

„В допълнение на договорно регламентирания си правомощия за контрол и мониторинг на дейността на Изпълнителя, Възложителят упражнява и административен контрол върху изпълнението на задълженията на Изпълнителя по Договора чрез Звено за управление на проекта (ЗУП), в съответствие с правомощията му.

27 Обединение/Консорциум под формата на Гражданско дружество или Търговец (Нова)

Ако Изпълнителят е Обединение/Консорциум под формата на гражданско дружество или търговец, съставен от двама или повече партньори, всеки от тях, заедно и поотделно, трябва да бъде обвързан с Възложителя до окончателното изпълнение на договора, като водещият партньор е „ИСА 2000“ ЕООД. (да се попълни ако е приложимо). Той ще представлява Изпълнителя, вкл. ще има отговорност да отстранява дефекти по обекта, възникнали в рамките на гаранционния срок, чиято продължителност е съобразно приложимото законодателство, Водещият партньор представлява партньорите. Той е овластен да получава нареждания от името и за сметка на всички партньори, а цялостното изпълнение, включително плащанията, ще имат сила само по отношение на обединението.

Съставът или устройството на Обединението/Консорциумът не могат да бъдат променяни без предварителното съгласие на Възложителя.

Лице за контакт от страна на Възложителя (ръководител на проекта/ЗУП)
д-р Стоян Нейчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ИСА 2000 ЕООД
Залисана датчи
съгласно в. ЧОБЗ

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД




ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Лице за контакт от страна на Изпълнителя – представител на Изпълнителя (ръководител на екипа): Андон Троев Грозев, Република България, област София, община Столична, град София, п.к. 1111, р-н Слатина, ул. „Николай Коперник“ № 25, тел. 02/80-79-571; факс: 02/973-31-78; e-mail: rousse@isa2000.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



.....
/д-р инж. Сава Цавов – Управител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заклучени данни
/инж. Юлиян Инджур
свободно ет 4013D




----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Договор част 5:
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
/прилагат се/



Задължителен документ,
съгласно чл. 4.0РЗД

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ

ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Договор част 6:

РАЗЯСНЕНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПОСТАВЕНИ ОТ
УЧАСТНИЦИТЕ В ПЕРИОДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

/прилагат се/




Замислен - данна
Съгласно чл. 4,
ОПЗД

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД




ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНАДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Договор част 7:
ТАБЛИЦИ
/прилага се попълнен образец/




Заклучен датум
съгласно чл. 4 ОПСД

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД




ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Договор част 8:
ОФЕРТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
/прилага се/

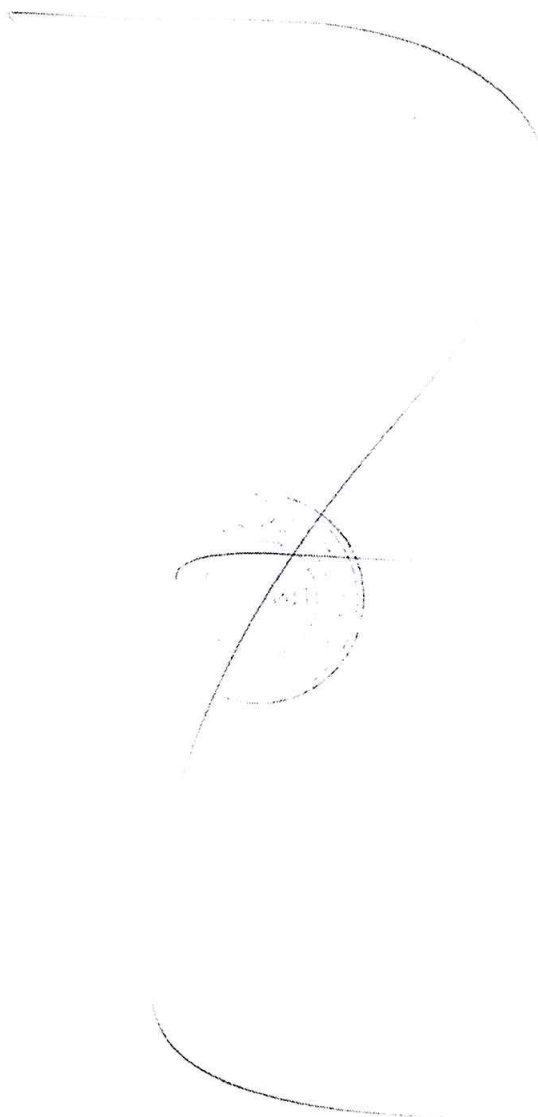

Заклучени датуми
съгласно тл. 4 ОПЗД

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ

ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Договор част 9:

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПОСТАВЕНИ ОТ ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ВРЕМЕ НА
ОЦЕНКАТА ОТНОСНО ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ОФЕРТАТА НА
УЧАСТНИКА, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ
/прилагат се/



*Заявенията са
обгледани съгласно ст. 4 от ВЗД*

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД





ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Договор част 10:
ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКУЕМИ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА
/прилагат се/

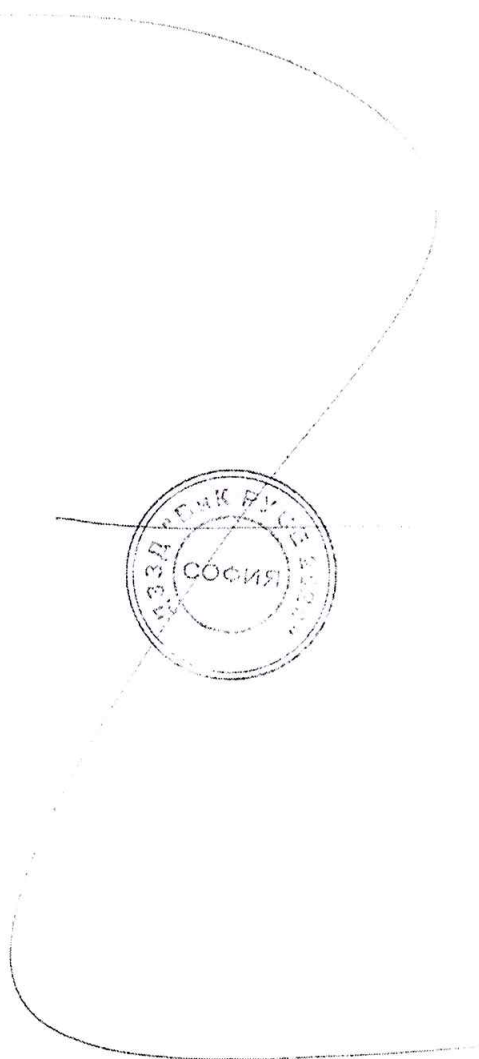

*Задължителни документи
съгласно чл. 4 ОРЗД*

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНАДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОКОЛНА СРЕДА

Договор част 11: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

Аз, долуподписаният Юлиан Седефов Инджов, в качеството ми на управител на ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, ЕИК по БУЛСТАТ 177468653, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, град София, п.к. 1111, р-н Слатина, ул. „Николай Коперник“ №25

В качеството си на Изпълнител по договор с Възложител „ВиК“ ООД-Русе декларирам, че:

1. Запознат/а съм с определението за **нередност**, съгласно приложимия регламент (ЕО) на Съвета, а именно:
„Нередност“: всяко нарушение на разпоредба на Общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.
2. Запознат/а съм с определението за **измама**, съгласно чл.1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие, свързано с:
 - Използването или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от Европейските общности или от тяхно име;
 - прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
 - разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.
3. Запознат/а съм, че по силата на договори за безвъзмездна финансова помощ за проекти, финансирани чрез оперативни програми следва да подавам сигнали за наличие на нередности и измами или подозрение за нередности и измами на **служителя по нередности на бенефициента и ръководителя на бенефициента**;
4. Ангажирам се да запозная всички мои служители и подизпълнители (ако е приложимо), работещи по изпълнението на конкретния договор, с определението за нередности и измама, както и с процедурите за докладване на всеки случай на подозрение и/или доказан случай на нередности.
5. Запознат/а съм че при наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности и измами, със случая на нередност, информацията се подава директно до:
 - Възложителя;
 - Ръководител на сертифициращия орган в Министерство на финансите;
 - ЦЗК;
 - OLAF;

Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра, по един: за декларацията и за служителя по нередности на бенефициента.

Дата: 31.12.2020г.

Декларатор

Юлиан Седефов

Управител



----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД – Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОФЕРТАТА

ЗА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО):	ОБЕКТ: Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – „Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“
---	--

Предмет	Клауза	Данни
Име и адрес на Възложителя	1.1.2.2 & 1.3	д-р инж. Сава Савов – управител на „ВиК“ ООД – Русе гр. Русе 7000, ул. „Добруджа“ № 6
Участник	1.1.2.3 & 1.3	ДЗЗД „ВиК Русе 2020“
Инженер	1.1.2.4 & 1.3	ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ СКАД“
Срок за завършване	1.1.3.3 & 8.2	Време за завършване: не по-късно от 30.06.2022 г. за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на Обекта (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера)
Срок за съобщаване на дефекти	1.1.3.7 & 11.1	365 календарни дни
Електронни системи за съобщения	1.3	Факс и/или електронна поща
Водещо законодателство	1.4	Българско законодателство
Език на договора и език за комуникация	1.4	Български език
Време за достъп до площадката	2.1	от датата на получаване на уведомително (възлагателно) писмо на Възложителя
Срок за предаване на програмата	8.3	14 дни от Датата на започване
Нормално работно време	6.5	7:00 - 20:00 ч. понеделник – събота 08.00 до 19.00 ч. неделя
Размер, валута и срок на гаранцията за изпълнение	4.2	Размер: 5 % от приетата от Възложителя договорна сума, с вкл. провизорни суми; валута: BGN; срок: не по-малко от Срока за завършване (виж 8.2) плюс Срока за съобщаване на дефекти (виж 11.1) плюс 28 дни
Нормално работно време	6.5	8 часа на ден
Неустойка за неизпълнение на програмата	8.6	0.5 % от стойността на съответния сертификат без ДДС за всеки ден на неизпълнение на програмата

Замислен датум,
- съгласно т. 4
0832

Предмет	Клауза	Данни
Максимален размер на неустойката за неизпълнение на програмата	8.6	20 % от стойността на съответния сертификат без ДДС
Неустойка за забава	8.7	0.05 % от приетата от Възложителя договорна сума без ДДС за всеки ден от закъснението; валута: BGN
Максимален размер на неустойката за забава	8.7	15 % от приетата от Възложителя договорна сума (без ДДС)
Провизорни суми	13.5 (б)	Стойността е съобразно ценовото предложение (без ДДС)
Ставка за печалба	13.5 (б)	5 % от действително направените разходи
Авансово плащане	14.2	Еднократно плащане в размер на 10 % от предложената цена по ценови таблици, без вкл. провизорни суми и без ДДС, валута: BGN
Размер на удържките за възстановяване на авансовото плащане	14.2 (б)	15 % от сертифицираната от Инженера сума за съответното междинно плащане, призната за постоянните работи, без да се вземат предвид авансовото плащане и удържките и изплащанията на задържани суми
Процент на задържаните суми	14.3	15 % от сертифицираната от Инженера сума за съответното междинно плащане, призната за постоянните работи до достигане на лимита съгл. под-клауза 14.3
Лимит на задържаните пари	14.3	5 % от приетата договорна сума без ДДС
Минимална сума за междинни плащания	14.6	0 % от приетата договорна сума без ДДС
Валута	14.15	Български лева (BGN)
Срокове за предаване на застраховките	18.1	Доказателство за направена застраховка за професионална отговорност на строителя и проектанта – при подписване на договора. Доказателство за направена застраховка на обекта - съответните полици до 21 дни след датата на започване.
Минимално застрахователно покритие за отговорност към трети лица	18.3	10 % за Изпълнителя от приетата договорна сума, но не по-малко от минимално посочените в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството

Дата 02/02/2021 г.

Име и фамилия Юлиан Инджов

Подпис =

Наименование на участника,
избран за изпълнител и печат

ДЗЗД „ВиК Русе-2020“



Залисани данни, согласно ст. 4 ОВЗ

Стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки за строителство и инженеринг (проектиране и строителство) на ВиК инфраструктура

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОФЕРТАТА

ЗА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО):	ОБЕКТ: Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – „Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“
---	--

Предмет	Клауза	Данни
Име и адрес на Възложителя	1.1.2.2 & 1.3	д-р инж. Сава Савов – управител на „ВиК“ ООД – Русе гр. Русе 7000, ул. „Добруджа“ № 6
Участник	1.1.2.3 & 1.3	Дружеството по ЗЗД „ВиК Русе 2020“
Инженер	1.1.2.4 & 1.3	
Срок за завършване	1.1.3.3 & 8.2	Време за завършване: не по-късно от 30.06.2022 г. за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на Обекта (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера)
Срок за съобщаване на дефекти	1.1.3.7 & 11.1	365 календарни дни
Електронни системи за съобщения	1.3	Факс и/или електронна поща
Водещо законодателство	1.4	Българско законодателство
Език на договора и език за комуникация	1.4	Български език
Време за достъп до площадката	2.1	от датата на получаване на уведомително (възлагателно) писмо на Възложителя
Срок за предаване на програмата	8.3	14 дни от Датата на започване
Нормално работно време	6.5	7:00 - 20:00 ч. понеделник – събота 08.00 до 19.00 ч. неделя
Размер, валута и срок на гаранцията за изпълнение	4.2	Размер: 5 % от приетата от Възложителя договорна сума, с вкл. провизорни суми; валута: BGN; срок: не по-малко от Срока за завършване (виж 8.2) плюс Срока за съобщаване на дефекти (виж 11.1) плюс 28 дни
Нормално работно време	6.5	8 часа на ден
Неустойка за неизпълнение на програмата	8.6	0.5 % от стойността на съответния сертификат без ДДС за всеки ден на неизпълнение на програмата

Заличени данни
свога село гр. Русе
ООД
ОРЗД

Предмет	Клауза	Данни
Максимален размер на неустойката за неизпълнение на програмата	8.6	20 % от стойността на съответния сертификат без ДДС
Неустойка за забава	8.7	0.05 % от приетата от Възложителя договорна сума без ДДС за всеки ден от закъснението; валута: BGN
Максимален размер на неустойката за забава	8.7	15 % от приетата от Възложителя договорна сума (без ДДС)
Провизорни суми	13.5 (б)	Стойността е съобразно ценовото предложение (без ДДС)
Ставка за печалба	13.5 (б)	5 % от действително направените разходи
Авансово плащане	14.2	Еднократно плащане в размер на 10 % от предложената цена по ценови таблици, без вкл. провизорни суми и без ДДС, валута: BGN
Размер на удържките за възстановяване на авансовото плащане	14.2 (b)	15 % от сертифицираната от Инженера сума за съответното междинно плащане, призната за постоянните работи, без да се вземат предвид авансовото плащане и удържките и изплащанията на задържани суми
Процент на задържаните суми	14.3	15 % от сертифицираната от Инженера сума за съответното междинно плащане, призната за постоянните работи до достигане на лимита съгл. под-клауза 14.3
Лимит на задържаните пари	14.3	5 % от приетата договорна сума без ДДС
Минимална сума за междинни плащания	14.6	0 % от приетата договорна сума без ДДС
Валута	14.15	Български лева (BGN)
Срокове за предаване на застраховките	18.1	Доказателство за направена застраховка за професионална отговорност на строителя и проектанта – при подписване на договора. Доказателство за направена застраховка на обекта - съответните полици до 21 дни след датата на започване.
Минимално застрахователно покритие за отговорност към трети лица	18.3	10 % за Изпълнителя от приетата договорна сума, но не по-малко от минимално посочените в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството

Дата 05/02/2020 г.

Име и фамилия Юлия

Подпис

Наименование на участника и печат

Дружеството по ЗЗД "Вик Русе 2020" ел. У ОРЗД

Замъски
Юлия Соловкова

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ЗА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА:	ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕКТ: Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – „Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“
---	--

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – „Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, КАКТО И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СМР

1.1. Срок за изпълнение на поръчката

Отчитаме посочените срокове за изпълнение на поръчката съгласно Приложението към офертата, като предлагаме:

A/ Време за завършване: не по-късно от 30.06.2022 г. за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на Обекта (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера).

B/ Отговорност по време на период за съобщаване на дефекти: 365 кал. дни (считано от издаване на Сертификат за приемане от Инженера до издаване на Сертификат за изпълнение от Инженера).

1.2. Гаранционни срокове за изпълнени СМР

Вид СМР	години
Всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях	10
Строителни, монтажни и довършителни работи, с изключение на работите, посочени по-горе	5
Завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика	5
Преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура	10
Скоростни пътища - 7 години; за републикански пътища от I и II клас - 5 години; за републикански пътища III клас - 5 години; при основен ремонт и реконструкция на всички пътища от републиканската пътна мрежа - 5 години; за останалите пътища и улиците - 5 години; при основен ремонт и реконструкция - 5 години	Съгласно посоченото в текста

Зарягени данни
Осигурено е чл. 49 от ЗО
Страница 15

Стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки за строителство и инженеринг (проектиране и строителство) на ВиК инфраструктура

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО

2.1 ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Представено, като приложение към настоящото предложение.

2.2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО

Представено, като приложение към настоящото предложение.

2.3 СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Представено, като приложение към настоящото предложение.

2.4 МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОНТРОЛ НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ. СПЕЦИФИЧНИ СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.

Представено, като приложение към настоящото предложение.

(При погълване на настоящото предложение следва да се съобразите с документацията за настоящата поръчка, включително с методиката за оценка)

Дата: 05.02.2020 г.

Инж. Юлиан Инджов – Управител на Дружеството


по ЗЗД "ВиК Русе 2020"

ЕООД

*Закрепени сумки,
съгласно чл. 4 от ЗЗД*

(имена и подпис на лицето – едно или повече, притежаващо права да подпише предложението; печат на участника ако е приложимо)

2.1.А. Организационна схема на изпълнението на поръчката: Инженеринг на обект: Реконструкция на ВМК мрежи в гр. Русе” с две обособени позиции; За Обособена позиция № 1: Инженеринг на обект: „Етап I - Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“

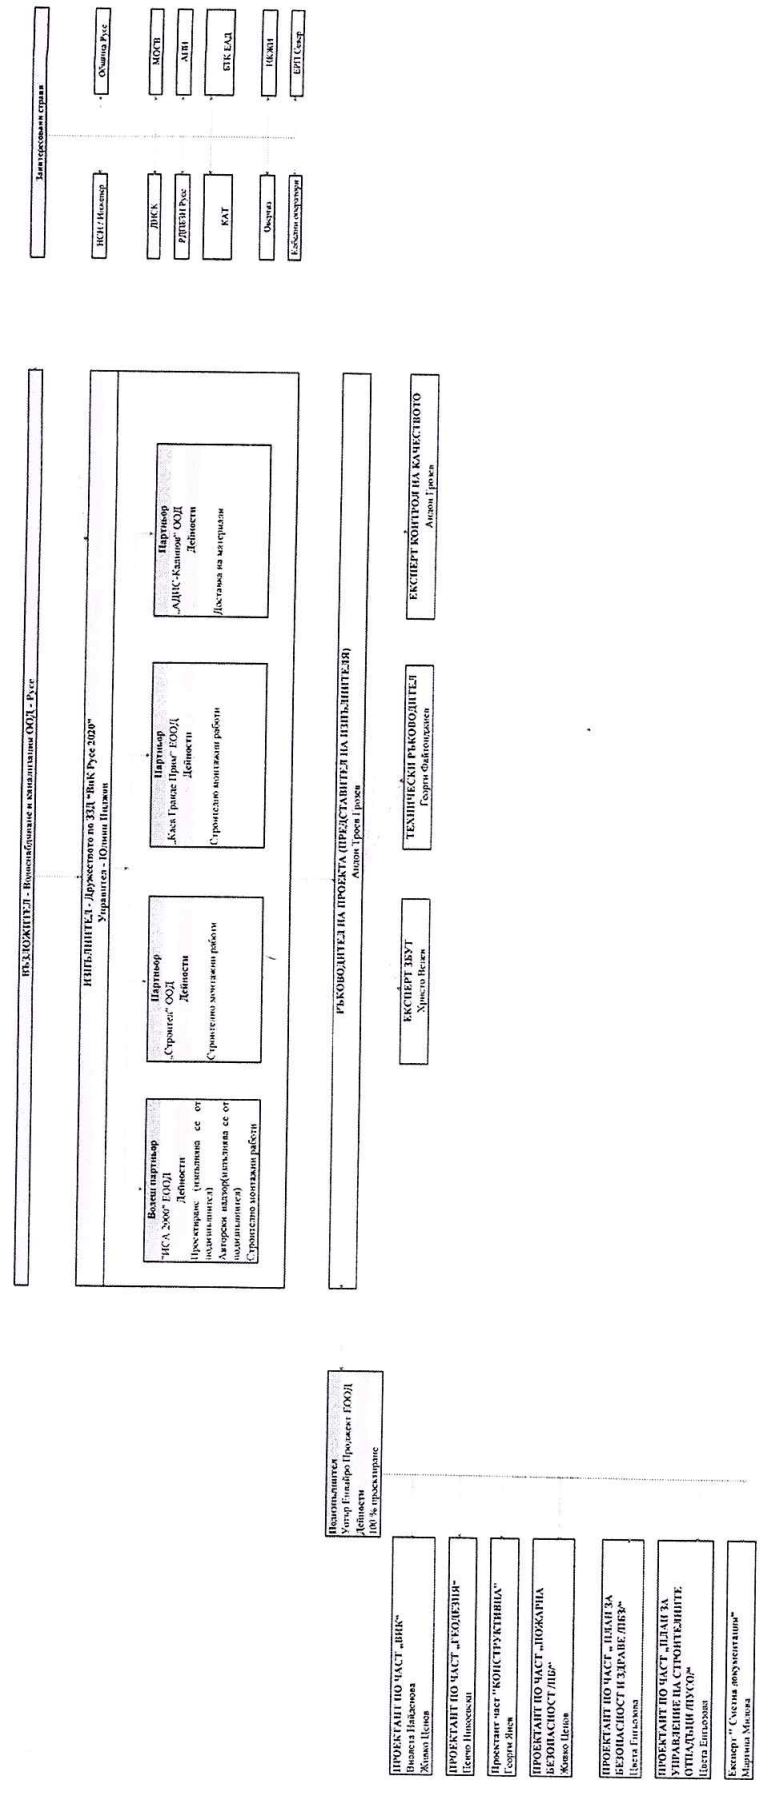


Велики партньор

Сградно-строителство ЕАД
0732

2.1.Б. Организация на персонала във връзка
с взаимоотношенията между страните по
време на изпълнение на поръчката

2.1.Б.1. Елементи, свързани едновременно с двете дейности (проектиране и изпълнение на строителство)


Защитни дрийми
Секторно чл. 4
Страница 19
ОРЗД

За ефективното изпълнение на дейностите и постигането на предвидените резултати, участникът ще концентрира ресурсите си върху няколко основни елементи:

- Отлично сътрудничество и свободен и навремен обмен на информация между екипа на изпълнителя и Възложителя, както и предоставяне на всякакъв тип информация и съдействие при поискване от страна на Възложителя;
- Управленска структура, формирана така, че да събере в едно допълващи се умения в рамките на интегриран, балансиран и конкретен екип от експерти с необходимото ниво на познание;
- Контролиране спазването на заложената последователност и проследяване качествено изпълнение на възложените дейности/поддейности;
- Информирание за всеки открит или неразрешен въпрос, касаещ подготовката и изпълнението на договора с официално писмо до Възложителя;
- Участие в анализирането на докладваната информация от отделните участници в процеса;
- Гъвкавост и адаптиране на стратегиите, моделите, и цялостното осъществяване на дейностите по отношение на законодателни, политически и/или икономически промени, с цел устойчивост на изпълнението.

Мобилизиране на екипа и провеждане на въстъпителна среща включва създаването на необходимата организация за изпълнението на конкретната поръчка.

Ще бъде проведена въстъпителна среща с Възложителя за представяне на екипа и възприетата организация на работа по изпълнението на обществената поръчка. Ще бъдат конкретизирани механизмите за комуникация с Възложителя и ще бъдат съгласувани дейностите в отделните етапи, сроковете и отговорните лица. Ще бъдат определени отговорните лица за комуникация от страна на Възложителя и Изпълнителя.

В тази подготвителна фаза ще бъде изготвено детайлно проучване на съществуващата водопроводна мрежа, и съоръжения по трасето ѝ.

Подробното запознаване с обекта е основополагащо за успешното поставяне на всички дейности по проекта, както и за постигане на целите на поръчката. Качественото изпълнение на тази дейност предопределя правилното преразпределение на времевия и експертен ресурс, доброто структуриране на комуникационните потоци между заинтересованите страни и отличната информационна обезпеченост на проекта. Изпълнителят ще извърши необходимите проучвателни работи за отделните компоненти на инвестиционния проект. Проучвателните работи представляват набиране на изходна информация, експертни проучвания, заснемания, експертизи, анализи, оценки и др. необходими за целите на проекта.

*Задължителни данни
съгласно чл. 4
ОФЗ 20*

2.1.Б.1.1. Организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация между него и представители на възложителя в процеса на инвестиционно проектиране и строителство

Изпълнителят ще назначи Представителя на Изпълнителя (Ръководител на проекта – инж. Андон Грозев) и ще му предостави всички необходими пълномощия да действа от името на Изпълнителя по силата на Договора.

Изпълнителят няма да отегля назначението на Представителя на Изпълнителя нито да назначава заместник без предварителното съгласие на Инженера.

Цялото време на Представителя на Изпълнителя ще бъде отдадено за ръководство на изпълнението на Договора от Изпълнителя. Ако Представителят на Изпълнителя се налага временно да отсъства от Площадката по време на изпълнението на Обекта, ще бъде назначавано подходящо лице за заместник, подлежащо на предварителното съгласие на Инженера, като Инженерът съответно ще бъде уведомен.

Представителят на Изпълнителя (Ръководителя на проекта) ще получава указания от името на Изпълнителя съгласно Под-Клауза 3.3 [Указания от Инженера].

Представителят на Изпълнителя може да предоставя които и да са от своите правомощия, функции и пълномощия на всяко компетентно лице и може по всяко време да отменя предоставянето. Никое предоставяне или отменяне няма да влязат в сила докато Инженерът и Възложителят не получат предизвестие, подписано от Представителя на Изпълнителя, назоваващо поименно лицето и определящо точно правомощията, функциите и пълномощията, които се предоставят или отменят.

Представителят на Изпълнителя и тези лица ще владеят добре езика за съобщения, определен в Под-Клауза 1.4. [Закон и Език], в противен случай Изпълнителят ще осигури за своя сметка по всяко време компетентни преводачи съобразно нуждите и ще бъде отговорен за качеството на превода при предаването на информацията по Договора.

Никакви важни действия на Страните по договора, като прокарване или затваряне на съществуващи пътища, водопроводни мрежи или други такива мрежи и системи, не могат да бъдат предприемани без предварителното одобрение от Инженера и съответните компетентни органи.

Изпълнителят ще информира писмено Инженера не по-късно от 7 (седем) дни, преди започването на такива работи.

Реализирането на работата по договора в сътрудничество с Възложителя е от критична важност. Установяването на работни контакти с Възложителя и при необходимост останалите заинтересовани страни, поддържане на постоянна обратна връзка и периодично докладване и обсъждане на разработките, използване на реализацията на дейностите по договора са от изключителна важност. Това аргументира сътрудничеството като задълж

Вашите данни,
Облачно сл. 4
0830
Страница 21

результатите от дейностите на участника да отговорят пълно и адекватно на реалните потребности.

Организационната структура, която участникът предлага е изградена върху принципа за йерархичен контрол при предоставяне на дължимото изпълнение и ефективна комуникация с Възложителя.

Тя се характеризира с:

- Единна точка на отчетност/отговорност;
- Контрол на качество и поддръжка на напредъка
- Адекватност на предложените човешки, технически и други ресурси в условията на опита и броя налични експерти, по начин, гарантиращ че изискванията на договора ще бъдат постигнати.

Получаването на изходни данни е от съществено значение за успешното изпълнение на всички дейности и поддейности в рамките на изпълнение на проектантската задача с оглед на обстоятелството, че актуалните и достоверни данни представляват основата при разработване на Техническия проект.

Организационно комуникацията с Възложителя по отношение на получаването на изходни данни и информация, както и във всички други ситуации при изпълнение на дейността ще се осъществи чрез официална кореспонденция, по електронен път, а в необходимите случаи ще се организират и проведат посещения на място.

След получаването и запознаването с наличната документация и информация, Изпълнителят ще се заеме с анализирането на пълнотата ѝ и, при необходимост, събирането на още необходими данни.

Следващият етап, към който ще се пристъпи ще е Геодезическо заснемане на трасетата, които попадат в обхвата на обекта и направата на геодезическа подложка за останалите части на инвестиционния проект във фаза Технически проект.

На база на геодезическата основа, проектантите по водещата част на проекта „ВиК“ ще изготвят основната част на проекта, съгласувайки действията си с проектантите на останалите части.

Следващият етап от изготвянето на Техническия проект за обект реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап I- реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи, в обхвата на който са 3,49 км водопроводна мрежа и 2,25 км канализационна мрежа, както и къроръженията към тях е разработването на останалите части и взаимното съгласуване помежду им.

Изпълнителят предвижда, след приключване на дейностите по проектиране и съгласуване на отделните части на Техническия проект, предаването им на възложителя и на компетентните лица да преглед, съгласуване и одобрение, след което на Инженера по ФИДИК да изготвянето

Валиден данни
с геодезич. У
Страница 22
ОРЗ Д

- по време на извършване на СМР – изкопните работи в участъците с известни проводите ще се извършват в присъствието на съответния оператор; в непосредствена близост до проводите, работата ще се извършва ръчно; след разкриване на проводите ще извършим укрепването му по предварително съгласуван със съответния оператор начин; ако все пак се допусне аварийна ситуация, работата по ВиК проекта се прекъсва до отстраняване на аварията (съгласно договорните споразумения) от съответния оператор.

При авария на неизвестен провод (местоположението на който не е бил посочен от съответния оператор) работата по ВиК се прекъсва и по списъка се търси и възлага отстраняване на аварията в съответните срокове.

2.4.Б.4 Мерки, целящи елиминирание или редуциране на вредното социално въздействие от СМР в часовия пояс 14-16 ч., както и в неработни дни

Обемът на възлаганите СМР предполага интензитет на работата, която ограничава възможностите за престой на работници, техника и механизация. Същевременно СМР ще се изпълняват в градска среда, което потенциално създава конфликт между живущите и бъдещият изпълнител на поръчката.

Изпълнението на работите ще създаде неудобства на местното население, което неимуемо ще доведе до негативни реакции.

Организация на работния процес по начин, чрез който ще се елиминира или редуцира вредното социално въздействие от СМР в часовия пояс 14-16 ч., както и в неработни дни ще се постигне от Изпълнителя, чрез прилагане на след конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки/действия.

При разработване на плана за строеж на обекта в гр. Русе, Изпълнителят, заедно с Възложителя и компетентните органи ще организират обществено обсъждане, в което могат да участват обществени организации, сдружения, физически и юридически лица, органи на изпълнителната власт и местното самоуправление, както и други заинтересовани страни. Чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин за мястото, всички засегнати от строителните дейности ще бъдат информирани.

♦ Мерки за намаляване на праховата запрашеност на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката

Изпълнението на обекта е свързан с употреба на тежко оборудване, което при работата си е възможно да предизвика запрашеност на атмосферния въздух. Изпълнителят ще вземе в предвид няколко мерки за намаляване до минимум на потенциалното запрашаване за околната среда. При изпълнението на строителните дейности на обекта ще се спазват всички мерки за превенция на запрашеността, чрез които се осигурява защита на човешкото здраве, на живата природа, на природните и културните ценности от вредните въздействия.

Работата със строителна механизация, оборудване и транспорт предполага на всеки строителен участък замърсявания от прах и отработени газове на обекта. За предотвратяване на запрашеността при изпълнение на строителните работи, при извършването на СМР ще бъдат спазвани всички нормативни изисквания по отношение на допустимите емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с

гр. София
Съгласно ст. 4032

неподвижни източници на емисии при работа с прахообразуващи и пасипни товари и материали.

Мерки за предотвратяване:

- Ще въведем контрол на движението на машините в района на строителния обект и преминавайки през населените места (предимно по време на изкопни работи) и на местата за достъп до него, като се ограничава тяхната скорост, особено по време на сухи и ветровити дни;
- За да се избегне износването на движещите се и въртящи се части на машините и съоръженията от прах, който прониква в тях, осъществяването на дейностите, при които има прахови емисии (напр. мястото за събиране) няма да се намират близо до въртящи се части на кран и тяхното съседство не е целесъобразно.
- Запрашените и замърсени пътни и пешеходни настилки ще бъдат почиствани и оросявани, за да се предотврати запрашаването на атмосферния въздух.
- При необходимост ще се предвиди оросяване на временно съхраняваните строителни отпадъци на строителната площадка.
- При транспортиране и заскладяване леките строителни материали ще се предпазват от разпръскване.
- Ще се приложат мерки за ограничаване на емисиите изгорели газове от строителната техника чрез ефективното ѝ използване.
- Ще бъде използвана само изправна и съвременна строителна техника, която отговаря на стандартите за отработените газове и е преминала съответните технически прегледи.
- Служителите ще са обучени и ще бъдат инструктирани за предприемане на всички приложими мерки за предотвратяване на замърсяването на въздуха.
- Ще се използват машини за рязане с кръгли елементи, снабдени с водни системи, които да намаляват количеството на изпускания прах;
- Местата, където емисиите от прах и частици се събират (подстъпите към обекта, в самия обект и т.н.), ще се почистват и мокрят редовно.

◆ *Мерки за опазване на качеството на атмосферния въздух:*

Качеството на въздуха е важно условие за здравословна околна среда. Постоянният състав на атмосферния въздух включва азот - 78,9%, кислород - 20,94%, въглероден диоксид - 0,03%, озон, инертни газове и водни пари. Всяка промяна в процентното съотношение на изброените елементи и вещества, а също и внасянето на нови, води до замърсяване на въздуха. Замърсяването може да бъде както от естествени природни процеси, така и в резултат на човешката дейност. Отговорност на всяка държава членка на ЕС е да провежда политика и да предприема необходимите мерки с цел намаляване на вредните емисии в атмосферата, съгласно действащите директиви.

Валиден датум
11.06.2014
СРЗР

Замърсяването на въздуха с вредно за човешкото здраве и за екосистемите. Този проблем е въпрос не само на местно ниво, но и на национално, европейско и световно равнище, тъй като замърсителите, освободени в една област, могат да бъдат транспортирани в атмосферата и да доведат до лошо качество на въздуха другаде.

Основните замърсители на въздуха са прахови частици, озон, NOx газове, серни оксиди, въглероден окис и олово, радиоактивни вещества, въглеродороди, алдехиди. Въглеродният оксид (CO) е безцветен газ без мирис, токсичен. Получава се при непълното изгаряне на въглища, природен газ и дървесни материали. Автомобилите също произвеждат въглероден оксид.

Източниците на замърсяване се разделят в две големи групи, в зависимост от произхода – естествени, и замърсители в резултат на човешката дейност.

Сред естествените източници са: вулканичната дейност, минералните извори, горските пожари, процеси на гниене, процеси под земната повърхност.

В резултат на човешката дейност най-големи замърсители са: моторните превозни средства, фабрики, заводи и промишлени предприятия, строителство, горене на дървесина за отопление, петролни станции, органични отпадъци, които освобождават метан и други

В хода на строителството неизбежно се образуват емисии от прах и отпадъчни газове, които е възможно да окажат въздействие върху близко разположените жилищни или чувствителни терени. Следните строителни дейности е най-вероятно да окажат въздействие върху качеството на въздуха:

- Работа с МПС и оборудване/работа на празен ход;
- Почистване и изкореняване на растителност, изкопни и кариерни дейности;
- Разбиване на скали;
- Работа с почвите
- Нарушаване на наклоните на почвите и баласта;
- Ерозия, причинена от вятъра на нестабилни/непокрити места;
- Съхранение на материали;
- Движение на МПС по неоформени пътища.

Транспортирането и трансфера на сухи гранулирани материали може да доведе до образуването на емисии от прах. Съхраняването и трансфера на горива или летливи химични съединения може да доведе до образуването на неорганизираните емисии.

Приносът на нашата фирма за намаляване замърсяването на атмосферния въздух е прилагане на мерки, базирани на:

- Спазване на европейските стандарти за опазване на околната среда по отношение на работата на строителната техника и оборудване, използването на транспорта при доставките, приемането на цялостни програми за управление с цел намаляване на консумацията на горива/повишаване на енергийната ефективност и за ограничаване

и контрол на емисиите от изгаряне, влагане на екологични материали и спазване на правилата и плана за управление на строителните отпадъци при унищожаването и обезопасяването им.

- При необходимост - мокрене на трасетата на превоз и строителните площадки в близост до критичните рецептори;
- Идентифициране на източниците на вода за мокрене, като се избягват конфликтите с други конкурентни нужди и по всяко време се гарантират минимални притоци към реките и потоците.
- Ако възникне нужда - покриване на площадките за складиране и строителните материали с платнища или други подобни средства.

◆ **Мерки за намаляване на вибрациите при изпълнение на поръчката**


Употребата на тежко оборудване при изпълнението на обекта е неизбежно, а то е съпроводено с шум и вибрации. Вибрациите пораждат въздействие, което влияе върху здравето и благосъстоянието на човешките рецептори, което от своя страна, е свързано с повишаване нивата на стрес и други значителни въздействия върху здравето. Освен въздействията върху здравето, повишените нива на шум и вибрации оказват въздействие и върху райони, предназначени за отдих, където високите нива на шум могат да повлияят отрицателно на привлекателността на местата и да доведат до спад на посещаемостта. Неблагоприятното въздействие може да засегне и ползвателите.

Източниците на шум и вибрации по време на строителство включват превозните средства, механизацията и оборудването, които ще се използват за извършване на строително-монтажните работи.

За да се сведе до минимум въздействието на шума и вибрациите от строителните работи се предвиждат следните

Мерки за предотвратяване:

- Избягване на ненужното форсиране на двигателите;
- Ще се провери сертификацията на шумовите емисии на строителната механизация, насочени към установяване и наблюдение на стойностите под определения стандарт. При необходимост ще се използват заглушители, или техниката ще бъде ремонтирана;
- Шумозаглушители ще се инсталират на особено шумните машини: компресори, електрически агрегати и т.н.;
- Двигателите на неработещите машини ще се спират;
- Ще се направи схема с пътя на машините, която ще показва тези места в близост до обекта, които са чувствителни към шум (училища, болници, жилищни комплекси и т.н.), като се отбелязват ограниченията по отношение на скоростта и се избират пътища, които не преминават през чувствителните зони. Препоръчания път ще се представи на машинните оператори и ще се постави на такова място, от което ще е видимо за всички хора работещи на обекта;



Замисли гални,
съгласно чл. 4
ОРЗД

- Зоните за събиране ще бъдат на места с бърз достъп до машините;
- В случай на особено шумни дейности, евентуално засегнатите субекти ще бъдат предварително информирани, като се посочва началното време на работите и техния приблизителен край;
- Инсталациите на обекта ще бъдат изградени на защитени места, от където идва по-малко шум;
- При необходимост ще бъдат поставени бариери, изолиращи разпространението на шум;
- Ще се намали височината на свободно падане на материали и изхвърлянето на отпадни материали (например ще се постави мрежа на всяка врата поставена на средно ниво за събирането на отпадни елементи по време на свалянето на кофража);
- Снабдяване на репродуциращите вибрационни елементи със средствата на тяхното намаляване с цел адаптация към ефективни норми;
- Периодично ще се правят измервания на шума на обекта в съответствие с инструкциите и разпоредби. Ще се анализират резултатите и ще се дефинират мерките, необходими за коригиране на ситуацията, при които стойностите надвишават тези посочени от законодателството.
- Редовна и ефективна поддръжка на механизацията и оборудването от обучен персонал, за да може да работят съгласно спецификациите на производителите


♦ **Мерки за намаляване на шума при изпълнение на поръчката**

Изпълнението на строително-монтажните дейности е съпроводено с голям брой шумни операции. Източници на шум най-често са пробивните инструменти; пневматичното работно оборудване; двигателите с вътрешно горене на различните видове машини и т.н. Работещите и живущи в района на обекта са изложени не само на шума, създаван от оборудването, но и на шумовото въздействие на заобикалящата ги среда, както и на шума от други дейности на строителната площадка.

Мерките за контрол на шума ще се планират и прилагат още преди започване на фактическата работа на строителната площадка - при проектирането на обекта, организацията и закупуването или наемането на машини и работно оборудване.

Технологичната последователност която ДЗЗД "ВиК РУСЕ 2020" ще приложи за изпълнение на работите за защита от шум, ще се съобразява с предвидените мерки в инвестиционния проект, местоположението на обекта, разстоянията до съседните сгради, продължителността и фазите на строителството, продължителността на работите през деня и през седмицата, както и от използваните строителни машини и транспортни средства.

Шумът трябва да се управлява активно веднага след започване на работата на строителната площадка.



Страница 372

Залисани датки
съгласно ст. 4
ОРЗД

За случаи, при които оценката на риска разработена в ДЗЗД "Вик РУСЕ 2020", установи превишаване на горната стойност на експозиция за предприемане на действия, ние ще разработим и приложим програма от технически и/или организационни мерки, за да сведем до минимум експозицията на шум и произтичащите рискове. Също така ще отстраним или да сведем до минимум рисковете, произтичащи от експозиция на шум при източника.

При наличие на наднормени нива на шум на работните места в зависимост от технологичните възможности се прилагат технически решения за неговото ограничаване чрез: екрани, кожуси, покрития, ограждения, звукопоглъщаща обработка на стени и тавани, изолиране, дистанционно управление на машини и съоръжения, звукоизолирани кабинни за персонала и др.

В случаите, когато е невъзможно по технологичен път или чрез прилагане на технически решения да се намали експозицията на шум, ДЗЗД "Вик РУСЕ 2020" ще осигури подходящи лични предпазни средства за защита на слуха на работещите на площадката.

ДЗЗД "Вик РУСЕ 2020" ще спазва заложените в Наредба 4/2006 г. изисквания за защита от шум, излъчван на строителната площадка, по време на изграждане на строежа. Нормативният документ изисква предвиждане на мерки за ограничаване на шума, излъчван на строителната площадка при извършване на шумни и много шумни работи и при използване на транспортни средства и строителни машини, които работят на открито. Според нормативния документ, мерките за ограничаване на шума по време на строителството зависят от разстоянието между строителната площадка и съседните сгради и помещения, периода от деня и от седмицата, през който се извършват строителните работи, продължителността на шумните и много шумните работи и нивото на шум в различните устройствени зони.

Съществуват три етапа за предпазване на живущите около строежа и работещите от шум, използвайки технически и организационни мерки:

- Контрол на шума при източника на възникване;
- Колективни мерки, включително организацията на работа;
- Лични предпазни средства за слуха.

Мерките за контрол на шума при източника на възникване включват:

- използване на машини с по-ниски емисии на шум;
- избягване на удари и съприкосновение на метал с метал;
- екраниране, за да се намали шума или изолиране на вибриращи части;
- монтаж на шумозаглушители;
- извършване на профилактична поддръжка - при износване на части от работното оборудване, с което нивото на шум може да се промени.

Колективни мерки за контрол:

Могат да се предприемат действия за намаляване експозиция на шум на всички, които могат да бъдат изложени на въздействието му, като допълнение на изброените по-горе мерки.



Зависели данни,
сегашно т.ч. 4
0132

- изолиране на шумните процедури и ограничаване на достъпа до шумните места;
- прекъсване на пътя на шума пренасян по въздуха, чрез изграждане на прегради и препятствия;
- използване на абсорбиращи материали за намаляване на отразения звук;
- контрол на шума и вибрациите пренасян по земята, чрез използване на свободно лежащи плочи.
- Сред мерките са и организиране на работата така, че да се ограничи времето за пребиваване на шумни места;
- при планиране извършването на шумна работа, ще се вземе под внимание времето, в което възможно най-малко работещи ще бъдат изложени на вредното му въздействие;
- прилагане на работен план, който да контролира експозицията на шум.
- ДЗЗД "ВиК РУСЕ 2020" ще създава такава работна среда, която ще е насочена към опазване на живота и здравето на ангажираните с изпълнението на обекта, и населението, засегнато от дейността ни.

◆ *Материали и механизация на обекта*

Ръководителя на проекта изготвя пълен актуализиран списък на материалите, които ще бъдат вложени в обекта, като описва произхода им, стандартите на които отговарят, технически характеристики и предоставя декларации за съответствие и/или сертификати за качество или протоколи от изпитване в лаборатория. Към този списък ще се изготви организационен план за доставка на материали, така че на работната площадка да не се допуска струпване на материали, които биха пречили на местното население.

Използване на обекта само техника, която е преминала технически преглед и контрол, непосредствено преди доставката и на обекта, поддържане на обекта на достатъчно резервни части с цел своевременно отстраняване на по-малки аварии. За техниката, която произвежда наднормен шум или прах, ще предприемем необходимите действия. Няма да се допуска струпване на техника на обекта

Преди започване на строителството, ДЗЗД "ВиК РУСЕ 2020" ще разработи "План за безопасност и здраве" (ПБЗ) в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и на основата на проектната документация.

Изпълнителят ще се грижи за своевременното актуализиране на "Плана за безопасност и здраве" при всяка промяна на обстоятелствата на площадката с цел да се гарантира сигурността на Обекта и безопасността на работещите на Площадката и на нейните посетители, и ще представя актуализираните документи на Инженера за преглед и одобрение. Инженерът има право в който и да било момент да поиска актуализиране на "Плана за безопасност и здраве" по своя инициатива, а Изпълнителят ще го направи в срок от 7 дни.



*Замисли галич
съгласно чл. 14
ДРЗД*

◆ **Работна зона**

Във времето между 14-16 ч. Изпълнителят ще преустанови дейности, които вдигат прекалено много шум и прах, и са в непосредствена близост до жилищни или търговски дейности. През това време на обекта ще се изпълняват СМР, който са с минимални нива на шум, и не вдигат прах. Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на обекта, които не са засегнати от събитията.

Изпълнителят ще преразглежда и промени организацията на работа, ако тя създава затруднения или неудобства за местното население, и ако и когато това е допустимо и ще удовлетвори изискванията на жителите.

Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсирани на забава в изпълнението на СМР.

Комуникация с местното население с цел установяване на източника на конфликт, и премахването му.

2.4.Б.5 Действия за намаляване на социалното напрежение в случай на постъпили жалби, сигнали, оплаквания и други подобни от лица, непосредствено засегнати от изпълняваните СМР

При реализация на обекти с подобен обем и обхват обичайно настъпва социално недоволство, макар и с временен характер, в резултат на което постъпват жалби, оплаквания и др. Общественото участие и подкрепа на проекта се базира на своевременна осведоменост на институции, организации, на населението и отделните обществени групи, относно целите на проекта и отражението му върху социалния статус и екологичните параметри на околната среда.

В настоящия проект обявен от ВиК ООД, гр. Русе, изпълнителят ще предприеме необходимите действия с които да сведе до минимум неудобствата от експлоатацията на ВиК системите, а при необходимост от прекъсване, ще информира местното население най-малко 2 дни по-рано.

Изпълнението на строителни дейности в урбанизирани територии създава ситуации на недоволство от местното население от гледна точка на шум, затваряне на улици за движение, прах, ограничаване на достъпа до комунални услуги и др. Предприемането на адекватни мерки от наша страна при възникване на ситуация, ще намали и предотврати социалното напрежение в следствие на изпълнението на обекта.

Изпълнителят ще предприеме всички необходими и подходящи мерки, за да осигури адекватно и безопасно обслужване на транспортния поток (автомобилен и пешеходен), като ограничи до минимум неудобствата за населението, вследствие на използването на пътища, тротоари и площи при извършване на строителните дейности.

Естеството на проекта би наложило навлизане в частните имоти за подмяна на съществуващите СКО например. В такива случаи, Изпълнителят ще процедира съобразно дадени му инструкции от Възложителя.

Предложение за конкретни действия, свързани с реализацията на изведените мерки:

Страница 375

Замилена Гаспар
съгласно ЗНЧ
ОРЪР

Избраната технология за изпълнение на строителството на обекта ще отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, избраната технология на изпълнение ще съответства на изискваните качество на изпълнение на работите, безопасното им изпълнение и експлоатация, мерки за опазване на околната среда. Изпълнителят ще предприеме всички мерки по опазване на околната среда от замърсяване с отпадъци и др.;

Проектът за временна организация на движението ще бъде изготвен така, че да се затварят минимален брой улици и да се намали до минимум ефектът от изпълнението на проекта върху населението

◆ **Информирание на населението:**

Обществеността е ключов фактор при извършването на СМР, тъй като дейността е свързана с постигането на максимален комфорт за тях, затова преди съществените СМР, Изпълнителят ще предприеме мерки за предварително информиране на населението за зоните на които ще се изпълняват съответните СМР. Изпълнителят ще съдейства на Възложителя в Мерките за информация и публичност, за да се информира коректно населението за ползите от проекта, както и за предстоящото спиране на подаването на вода до отделни участъци;

- Програма за информиране на обществеността преди започване на работа на обекта ще се извърши чрез местни медии, информационни табели разположени преди започването на СМР на обекта, с обозначени граници на действие на дружеството, период на действие.
- Независимо от тях, със съдействието на Възложителя ще се стремим живущите и работещите на обекта да са запознати с планираните дейности от наша страна.
- С цел информиране на населението за предстоящи СМР след съгласуване с Възложителя може да се публикува актуална информация за датите, местата и вида на СМР, които ще се извършват, на сайта на Възложителя и местните медии.
- Преди започването на СМР, при откриването на строителната площадка ще се проведе публично събитие на терена на обекта, с което ще се оповести намерението за започване на СМР от нас, с което работещите там и всички заинтересовани страни ще бъдат запознати. Табели с информация за извършването на строителни дейности ще поставим от двете страни на обекта.

◆ **Консултации със заинтересованите от проекта общински власти и институции, обществени групи и Възложителя.**

Адекватното взаимодействие с всички заинтересовани страни при реализацията на проекта е от ключово значение за качествено и успешно изпълнение на проекта.

Страница 376
Валиден датум
Съгласно Ст. 203Д

Важно е проектът да бъде подложен на обсъждане и да бъдат отчетени позициите на всички заинтересовани страни. Изпълнителят ще идентифицира и установи връзка с всички засегнати страни при осъществяване на проекта, ще бъде установен контакт с тях и ще им бъдат представени необходимите им документи (разрешителни, проекти, съгласувания и др.) за работа на обекта. Тази мярка има отношение към ограничаването на някои от възможните рискове от опозиция от населението живущо или развиващо дейност в съседство на обекта.

При необходимост ще се ангажират представителите на местната власт и гражданите и ако е нужно ще се организират срещи с общинския съвет (ОС), като се предвиди достатъчно време за обсъждане на проекта на специализирани комисии и експертни съвети към ОС.

Изпълнителят се ангажира да съдейства на Възложителя при организирането на обществени обсъждания и експертни съвети по преценка на Възложителя. Чрез отчитането на обществено мнение се елиминират редица рискове които биха довели до неудобство, протест, което от своя страна би довело до забавяне на изпълнението на СМР.

Защитава се интересът на обществото, като се взаимодейства с всички заинтересовани страни, като под взаимодействия се има предвид не само осигуряване на информираност, но и обратна връзка и отичане позициите на всички заинтересовани лица.

Изпълнителят ще работи за ефективното взаимодействие с всички заинтересовани страни, като ще заложи на непрекъснатата комуникация, иницирирането на обратна връзка и организирането на работни срещи с представяне на подходящи материали , разбираеми за всички страни.

Изпълнителят ще се запознае подробно с местността на обекта, зоните за извършване на СМР, и ще вземе всички необходими действия, с които да осигури комфорта на живущите в близост до обекта.

♦ *Постъпили жалби, сигнали, оплаквания и други подобни от лица, непосредствено засегнати от изпълняваните СМР*

При постъпване на жалби, сигнали, оплаквания и други подобни от лица, непосредствено засегнати от изпълняваните СМР, изпълнителят ще предприеме следните действия:

- *Идентифициране на причините:*

Изпълнителят ще съдейства на Възложителя, в рамките на правомощията си, за решаване на евентуални конфликти. Изпълнителят ще бъде запознат със засегнатите страни от дейностите по СМР, и незабавно ще предприеме действия за ограничаване, или ако е възможно премахване, на причините за недоволство от страна на местното население.

- *Определяне на оперативна среща за изясняване на негативната реакция, на която се извършват следните оперативни дейности:*

- ✓ Определяне на източника за такава реакция;

Изпълнителят ще изиска от Възложителя всички данни, касаещи терените, през които преминават трасетата на инсталации и мрежи; Изпълнителят ще съдейства на Възложителя в Мерките за информация и публичност за да се информира коректно населението за ползите от проекта;

Страница 377
Замачки данни
Съгласно т.ч.
ОРЪР

- ✓ Определяне на причината;
- ✓ Определяне на участника, в чиито задължения е възможността за преодоляване на негативната реакция;
- ✓ Вземане на управленско решение за начина за преодоляване на негативната реакция и удовлетворяване на исканията на местното население;

Изпълнителят ще преработи Календарния график и Работната си програма, така че при наличие на жалби, изпълнението на засегнатите участъци да се отложи във времето; Изпълнителят ще съдейства на Възложителя за предоставяне на необходимата документация, свързана с обжалването;

Изпълнителят ще изпълни всички предписания на ПБЗ, работната програма, мерките за опазване на околната среда, като се изградят предпазни ограждения, машините се поддържат в изправно състояние и работния процес се организира по такъв начин, че да се работи в светлата част на деня, като всички шумни процеси се изпълняват в позволените часови пояси;

- ✓ Извършване на разяснителна работа сред местното население, без да се прекъсват строителните дейности;
- ✓ Спазване на изискванията на законовите и подзаконовите актове;

Изпълнителят ще се придържа стриктно към разрешените от компетентните органи прозорци за спиране на подаването на вода или електричество (в случай на необходимост). През времето на спряно водоподаване ще бъдат осигурени водоноски (при необходимост);

При изпълнението на мероприятията по проекта за ВОД изпълнителя ще информира живеещите в засегнатите райони за промяната в организация на движение, ще ги информира за сроковете, през които ще са затворени улиците (урбанизираните територии) или ще е ограничено движението по тях

- ◆ *Ако до вземането на адекватно управленско решение се наложи спиране на дейностите, то се предприемат следните дейности за ускоряване на работите и изравняването им с планираните срокове:*

- Преразпределение на човешкия ресурс;
- Преминаване на двусменен режим на работа;
- Съвместяване на видове работи, които могат да се изпълняват едновременно;

Всички тези мероприятия се съгласуват с останалите участници в реализирането на поръчката и изграждането на обекта. Изпълнителят ще преработи Календарния график и Работната си програма, така че при наличие на жалби, изпълнението на засегнатите участъци да се отложи във времето, като за реализирането му ще бъде ангажирана допълнителна бригада.

Страница 378

Замислен датки,
Овладетел № 4
ОР 2



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОКОЛНА СРЕДА

Приложение № 6
Образец!

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Дружеството по ЗЗД "ВиК Русе 2020"

(три имена) Юлиан Седедов Инджов в качеството ми на Управител
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява) на Дружеството по ЗЗД "ВиК Русе 2020" (наименование на участник), с ЕИК (рег. №,
ако е приложимо) _____, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.
„Николай Коперник“ № 25 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: **Инженеринг на обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе“ с две
обособени позиции**

За обособена позиция/Обособени позиции № 1: **Инженеринг на обект: „Етап I -
Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната
и които са приложими към строителството.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни.

Наименование на участника
Дружеството по ЗЗД "ВиК Русе 2020"
Име и фамилия на представителя на участника
Инж. Юлиан Инджов
Длъжност
Управител на Дружеството по ЗЗД "ВиК Русе
2020"
Подпис



Дата: 05.02.2020 г.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия,
обслужвана от "ВиК" ООД - Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и
националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Цялата отговорност за публикацията
се носи от Бенефициента – ВиК ООД - Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отражава официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.“

Замисли дажи
Създадено от ЧОЗД

Съхранява се в ЕСОС 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Наименование на Участника:	Дружеството по 33Д "ВиК Русе 2020"
Седалище по регистрация:	област София, община Столична, гр. София-1111, р-н Слатина, кв. "Гео Милев", ул. "Николай Коперник" №25
ВИС:	-
ИВАН:	-
Банка:	-
Булстат номер:	-
Точен адрес за кореспонденция:	Република България, област София, община Столична, гр. София-1111, р-н Слатина, кв. "Гео Милев", ул. "Николай Коперник" №25
Телефонен номер:	02/80 79 550
Факс номер:	02/973 31 78
Лице за контакти:	Юлиян Инджов
e mail:	rousse@isa2000.bg

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе; Етап I – „Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“
----------------------------	--

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение.

Цената е формирана въз основа на посоченото в Приложение № 5.2, както следва:

№	ДЕЙНОСТ	Предлагана стойност в лева без ДДС
1	ПРОЕКТИРАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТА	215,000.00
2	СМР ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ	2,518,575.42
3	СМР КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ	4,701,832.72
4	АВТОРСКИ НАДЗОР	36,000.00
5	ОБЩО	7,471,408.14
6.1	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ/ПРОВИЗОРНИ СУМИ - СМР ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ (до 10% от 2)*	251,857.54
6.2	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ/ПРОВИЗОРНИ СУМИ - СМР КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ (до 10% от 3)*	470,183.27
7	ОБЩО С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ	8,193,448.95

Забележки:

1. Посочената цена включва всички разходи по изпълнението предмет.

Заклучени данни
съгласно чл. 4
09/22

2. Цената за СМР е образувана въз основа на ценови показатели и количествено-стойностните сметки по уедрени показатели (Приложения №№ 5.1 и 5.2);
3. * - без технологично оборудване.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ВАЖНО!!! Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При констатиране технически грешки, включително и аритмитични такива, участникът се отстранява от участие.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 – Ценови показатели за формиране на единичните цени и

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.2 – Количествено-стойностни сметки по уедрени показатели.

Подпис:

Дата 05/02/2020

Име и фамилия Юлиан Инджов

Длъжност Управител

Наименование на участника Дружеството по ЗЗД “ВиК Русе 2020”

*Заложени данни
Согласно чл. 4 от ЗЗД*
